


幹線管路耐震化事業 位置図

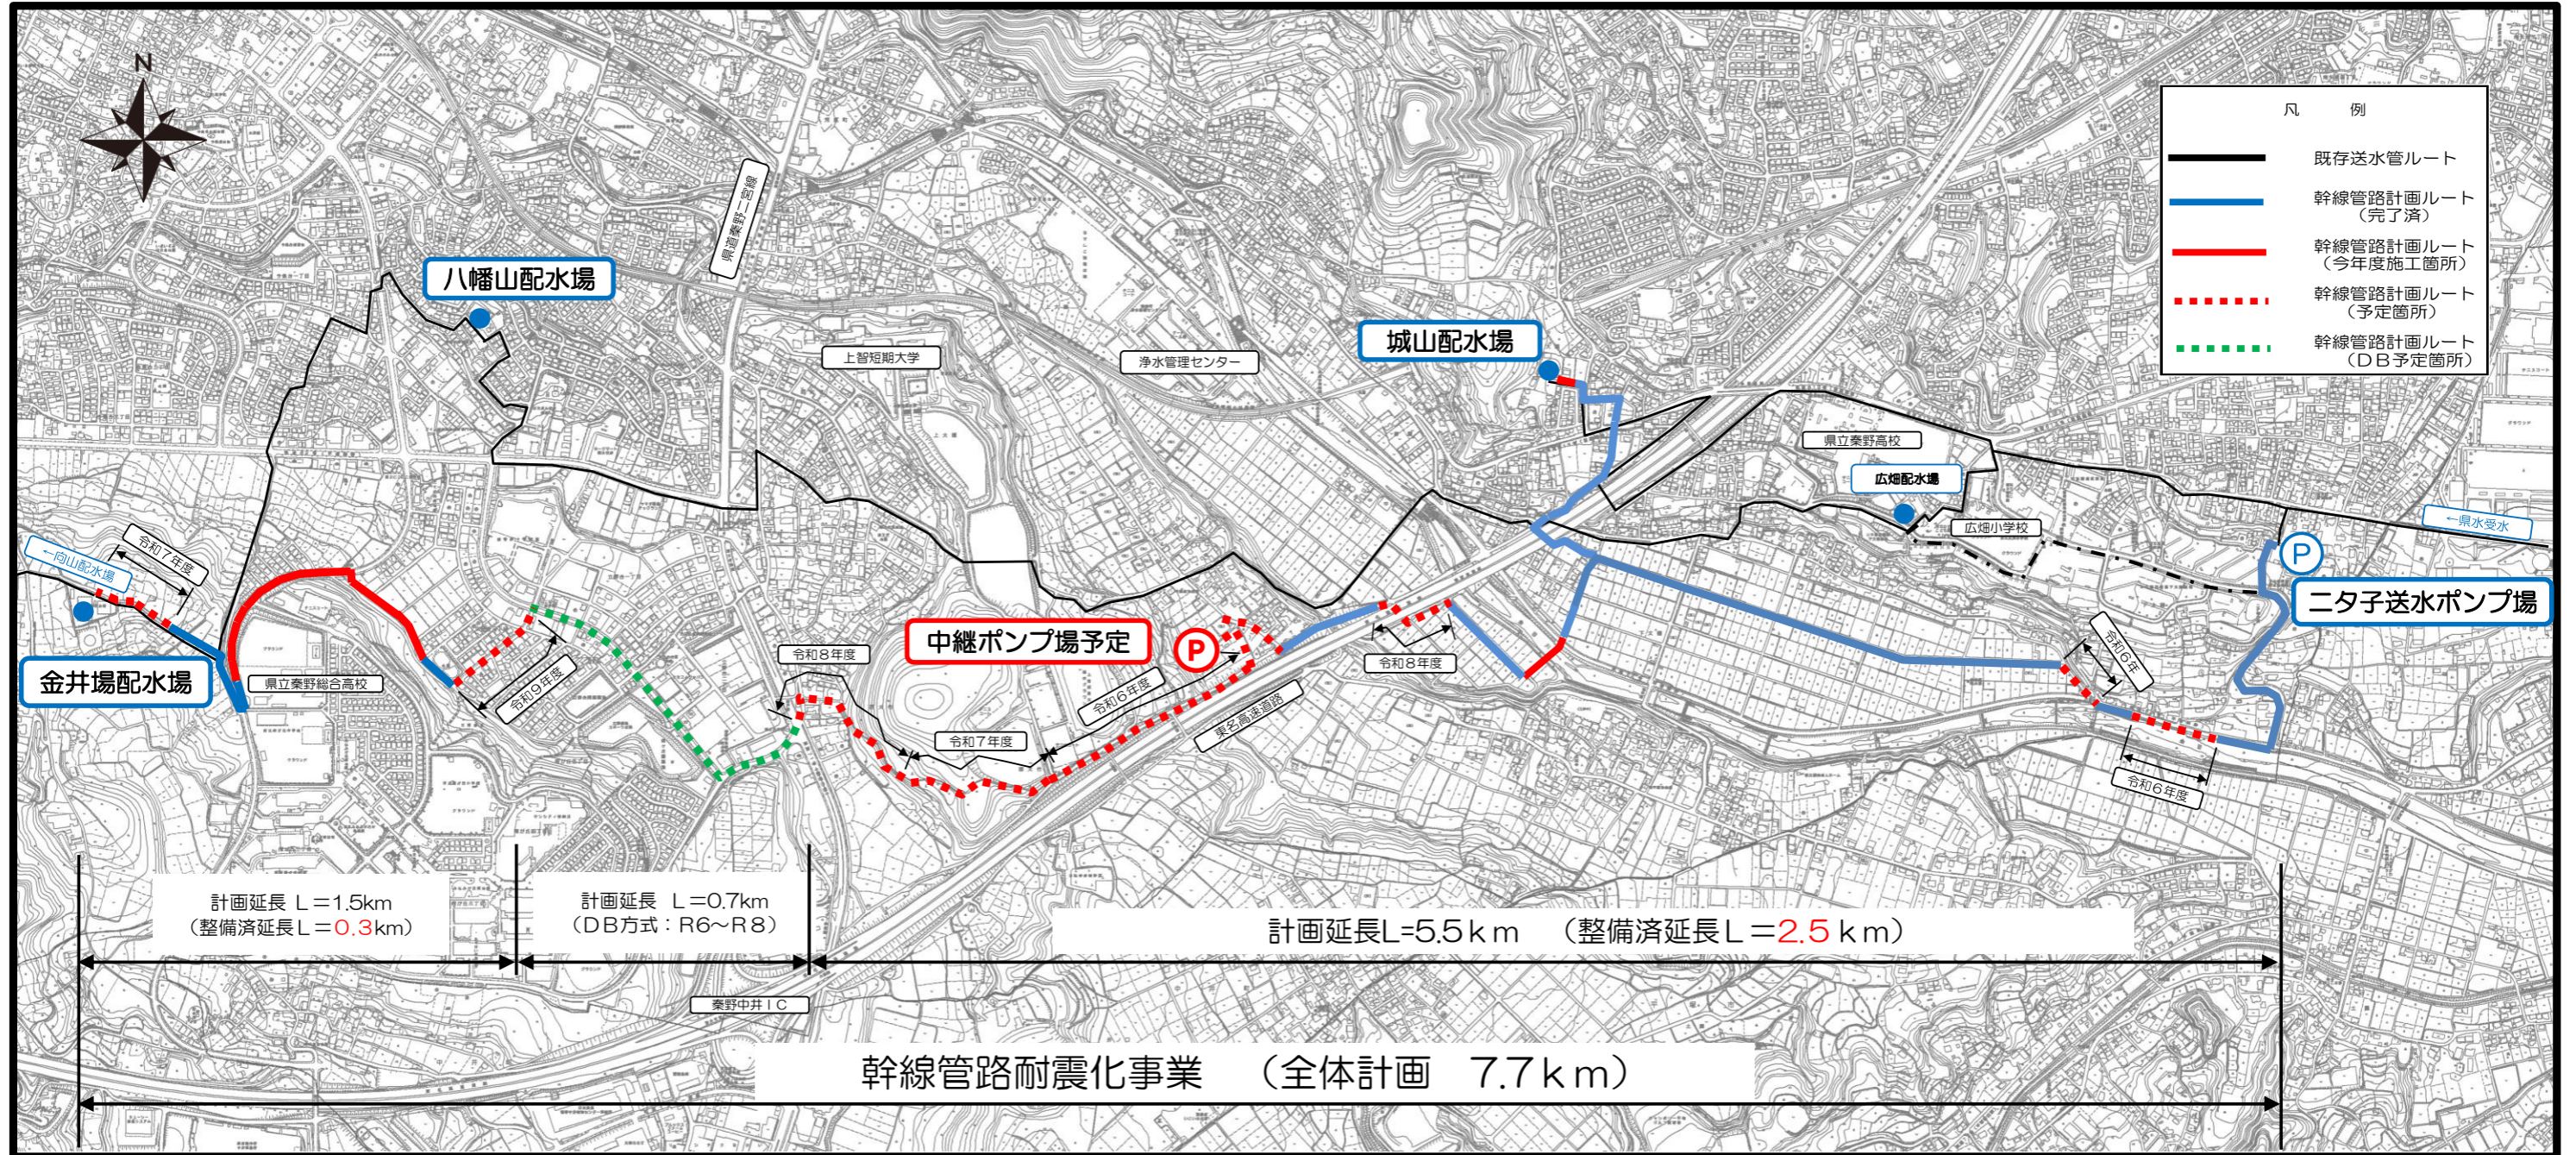

幹線管路の整備状況 及び 基幹管路の耐震化率

		2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	備 考
施設整備計画	整備延長	389m	674m	732m	1,070m	901m	594m	1,180m	
	整備済延長	2,519m	3,193m	3,925m	4,995m	5,896m	6,490m	7,670m	計画延長 L=7,670m
	整備率	33%	42%	51%	65%	77%	85%	100%	整備済延長/計画延長
実 績	整備延長	377m	478m	1,035m					
	整備済延長	2,398m	2,876m	3,911m					計画延長 L=7,670m
	整備率	31%	37%	51%					整備済延長/計画延長
基幹管路の耐震化率	施設整備計画	44.9%	46.7%	48.9%	51.8%	54.1%	55.8%	58.6%	
	実 績	47.7%	49.8%	52.0%					
