


秦野市交通バリアフリー特定事業計画

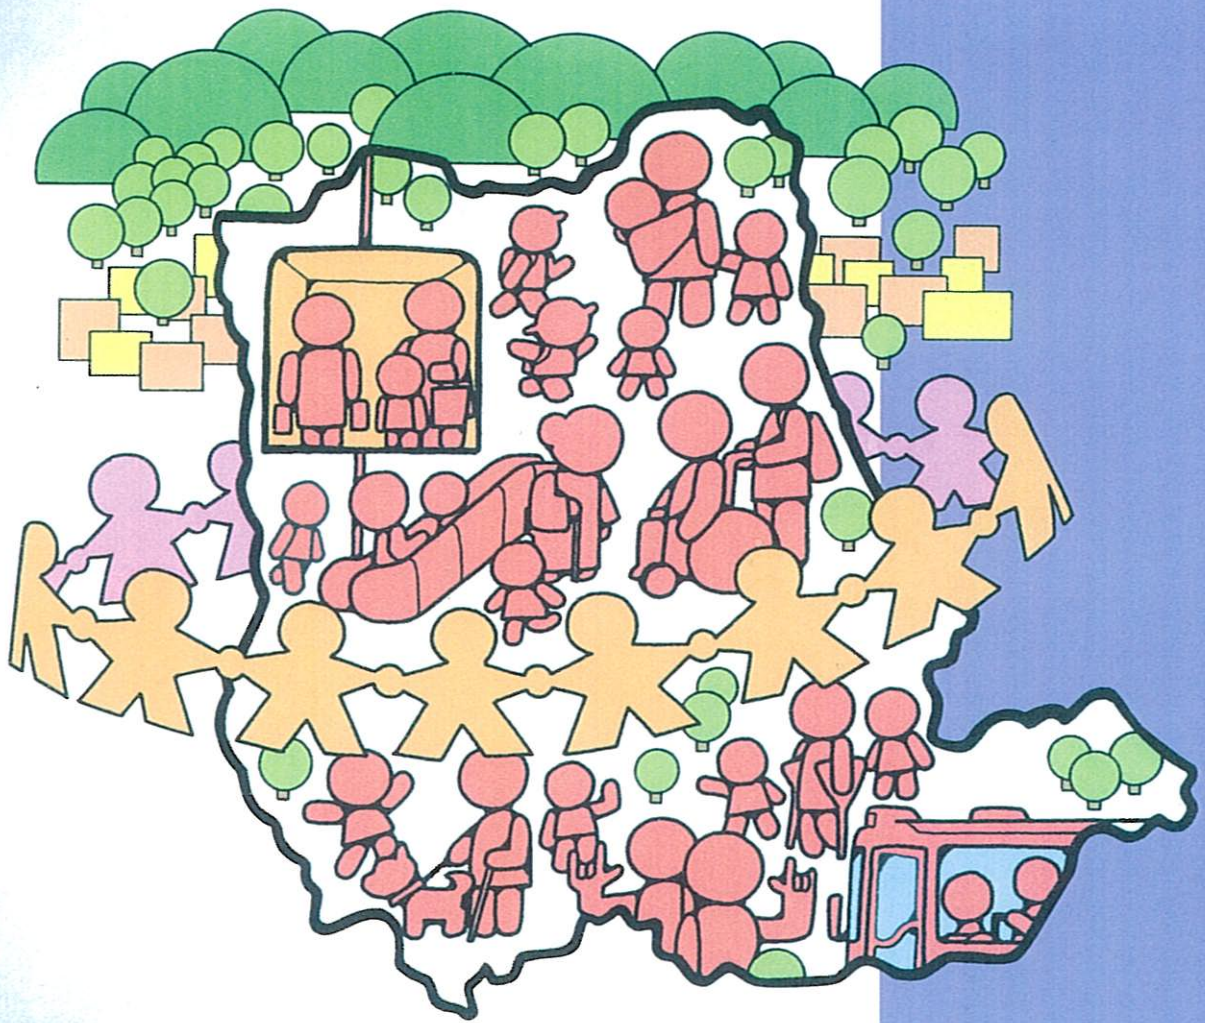

秦野市

目 次

第1章 特定事業計画の策定にあたって	1
1 背景と目的	1
2 特定事業計画の体系	1
3 重点整備地区と特定経路	2
4 特定事業計画で定める事項	2
(1) 公共交通特定事業について	2
(2) 道路特定事業について	3
(3) 交通安全特定事業について	3
5 公共交通特定事業における基本的な整備内容	3
6 道路特定事業における基本的な整備内容	4
7 交通安全特定事業における基本的な整備内容	5
8 その他の事業について	5
(1) 駅前広場について	5
(2) 主要準特定経路について	6
(3) 準特定経路について	7
第2章 各重点整備地区での事業内容	8
1 秦野駅周辺地区	8
(1) 公共交通特定事業計画の事業内容と実施予定年度	8
(2) 路線別道路特定事業計画の事業内容と実施予定年度	9
(3) 交通安全特定事業計画の事業内容と実施予定年度	14
(4) その他の事業内容と実施予定年度	14
1) 駅前広場に関する事業計画(秦野駅)	14
2) 公衆便所に関する事業計画(秦野駅)	15
3) 主要準特定経路に関する事業計画	16
2 鶴巻温泉駅周辺地区及び東海大学前駅周辺地区	18
2-1 鶴巻温泉駅周辺地区	
(1) 公共交通特定事業計画の事業内容と実施予定年度	18
(2) 路線別道路特定事業計画の事業内容と実施予定年度	19
(3) 交通安全特定事業計画の事業内容と実施予定年度	22
(4) その他の事業内容と実施予定年度	23
1) 駅前広場に関する事業計画(鶴巻温泉駅)	23
2) 公衆便所に関する事業計画(鶴巻温泉駅)	23
3) 主要準特定経路に関する事業計画	24
2-2 東海大学前駅周辺地区	25
(1) 公共交通特定事業計画の事業内容と実施予定年度	25
(2) 路線別道路特定事業計画の事業内容と実施予定年度	26
(3) 交通安全特定事業計画の事業内容と実施予定年度	28

(4) その他の事業内容と実施予定年度	29
1) 駅前広場に関する事業計画（東海大学前駅）	29
2) 公衆便所に関する事業計画（東海大学前駅）	31
3 渋沢駅周辺地区	32
(1) 公共交通特定事業計画の事業内容と実施予定年度	32
(2) 路線別道路特定事業計画の事業内容と実施予定年度	33
(3) 交通安全特定事業計画の事業内容と実施予定年度	36
(4) その他の事業内容と実施予定年度	37
1) 駅前広場に関する事業計画（渋沢駅）	37
2) 公衆便所に関する事業計画（渋沢駅）	40

第3章 特定事業計画の推進に向けて.....41

第1章 特定事業計画の策定にあたって

1 背景と目的


秦野市では、平成12年11月に施行された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」いわゆる交通バリアフリー法に基づき、平成14年3月に市民や関係機関との協働により「秦野市交通バリアフリー基本構想」を策定しました。

この基本構想の策定を受け、市内小田急線4駅とその周辺道路、駅前広場、信号機等について、重点的かつ一体的に交通バリアフリー化を進めるため、公共交通事業者（小田急電鉄株式会社・神奈川中央交通株式会社・株式会社湘南神奈交バス）は「公共交通特定事業計画」、道路管理者（国土交通省・神奈川県・秦野市）は「道路特定事業計画」、神奈川県公安委員会は「交通安全特定事業計画」を作成することになります。

本計画は、これら特定事業計画を各事業者の協力の下、各事業計画間の整合を図り、本市における交通バリアフリー計画をより明確にするため、可能な限りまとめたものです。

今後は、市民、事業者、行政などのすべての人が協力して、連続性のある交通バリアフリー化に向け積極的に取組み、「すべての人にやさしい交通環境づくり」の実現を目指します。

2 特定事業計画の体系

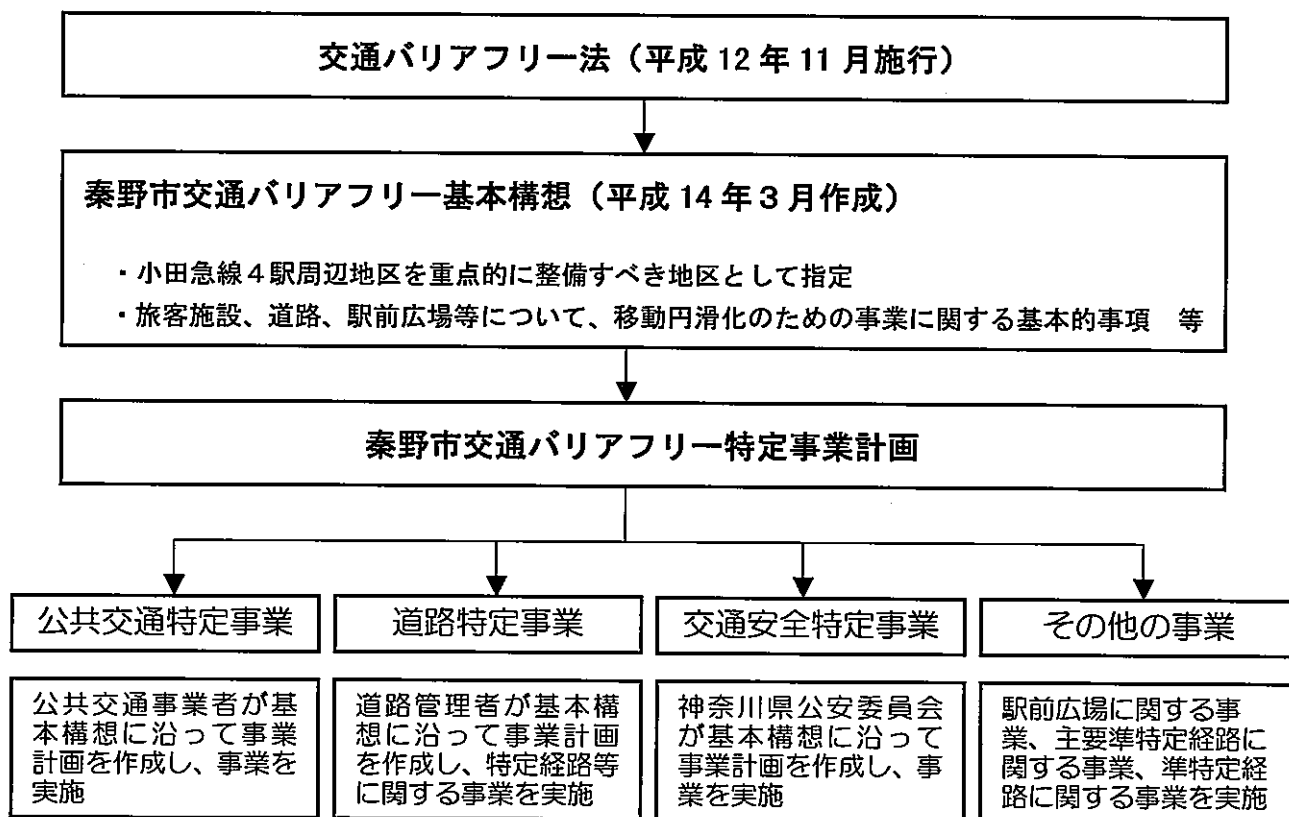

3 重点整備地区と特定経路

重点整備地区は、特定旅客施設である小田急線4駅（秦野駅、鶴巻温泉駅、東海大学前駅、渋沢駅）周辺において、各駅を中心として徒歩圏内（おおむね1キロメートル以内）を対象に主要施設の分布状況や利用状況等を考慮して設定した区域です。

その区域内で、特定旅客施設から官公庁施設、福祉施設、大規模店舗など高齢者、身体障害者等が日常よく利用する施設までを結ぶ経路を特定経路として位置付け、平成22年（2010年）までに整備を推進します。

■重点整備地区と特定経路

重点整備地区	事業主体	路線名	延長
秦野駅周辺地区	神奈川県	県道704号	310m
		県道705号	50m
	秦野市	市道6号線	895m
		市道82号線	208m
		市道650号線	482m
鶴巻温泉駅周辺地区及び東海大学前駅周辺地区	神奈川県	県道612号	350m
		県道614号	300m
	秦野市	市道8号線	600m
		市道411号線	90m
		市道418号線	100m
渋沢駅周辺地区	国土交通省	国道246号	560m
	神奈川県	県道706号	600m
		県道707号	230m
	秦野市	市道84号線	325m

4 特定事業計画で定める事項

平成14年3月に策定した「秦野市交通バリアフリー基本構想」をもとに、公共交通事業者（小田急電鉄株式会社・神奈川中央交通株式会社・株式会社湘南神奈交バス）、道路管理者（国土交通省・神奈川県・秦野市）、神奈川県公安委員会は、市内小田急線4駅とその周辺道路、駅前広場、信号機等について、具体的な実施計画として次のような事項を定めます。

(1) 公共交通特定事業について

①公共交通特定事業の対象となる特定旅客施設

「秦野市交通バリアフリー基本構想」に定められた公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の位置を示します。

②公共交通特定事業の内容と実施予定期間

特定旅客施設毎に、問題箇所を把握した上で、実施すべき事業の内容及び実施予定期間を示します。

(2) 道路特定事業について

①道路特定事業を実施する道路の区間

「秦野市交通バリアフリー基本構想」に定められた道路特定事業を実施する経路（＝特定経路）の区間を示します。

②道路区間毎に実施すべき道路特定事業の内容と実施予定期間

道路区間毎に、問題箇所を把握した上で、実施すべき事業の内容及び実施予定期間を示します。

③その他道路特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

事業実施に際し配慮すべき重要事項を示します。

(3) 交通安全特定事業について

①交通安全特定事業を実施する道路の区間

「秦野市交通バリアフリー基本構想」に定められた交通安全特定事業を実施する経路（＝特定経路）の区間を示します。

②道路区間毎に実施すべき交通安全特定事業の内容と実施予定期間

道路区間毎に、問題箇所を把握した上で、実施すべき事業の内容及び実施予定期間を示します。

5 公共交通特定事業における基本的な整備内容

(1) 鉄道の整備について

- ・昇降施設（エレベーター等）の設置を推進します。
- ・トイレ等施設については、利用しやすさや認知性を向上させる整備を推進します。
- ・新型券売機の導入及びカウンターの改修を行い、利用者の安全かつ円滑な利用に努めます。
- ・職員に対するバリアフリーへの意識の向上と教育訓練の拡充に努めます。

(2) バスの整備について

- ・時刻表、行き先案内板などの改善により、認知性の向上に努めます。
- ・バス停留所への上屋の設置など待合施設の設置を推進します。
- ・低床化バス車両の導入を推進します。
- ・職員に対するバリアフリーへの意識の向上と教育訓練の拡充に努めます。

6 道路特定事業における基本的な整備内容

(1) 歩道の整備について

- ・車いす使用者が相互にすれ違えるよう、連続的に有効幅員を2 m以上確保できるように努めます。
- ・こう配や段差等の改善による連続した路面の平坦化に努めます。

整備前



整備後



セミフラット歩道

- ・色や連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置を推進します。

整備前



整備後



視覚障害者
誘導用ブロック

- ・滑りにくく、水はけのよい舗装による整備を推進します。
- ・必要に応じて照明施設の設置を推進します。
- ・主要な交差点、公共施設周辺等には、利用する施設への距離や方向などを表示した案内標識を設置します。

(2) 交差点部の整備について

- ・交差点部等には、視覚障害者誘導用ブロックを設置し、安全に通行ができるように整備します。
- ・横断歩道に接続する歩道には、車いす使用者などが滞留できるように平坦部の確保に努めます。
- ・横断歩道に接続する歩道には、車いす使用者などが安全に通行できるように段差改善ブロックの設置を推進します。
- ・交差点の歩道巻き込み部には、舗装色を変え視認性を高めます。
- ・交差点の歩道巻き込み部に巻き込み防止ポールを設置し、歩行者の安全の確保に努めます。

警察署前交差点（秦野駅周辺地区）



巻き込み
防止ポール
視覚障害者
誘導用ブロック
舗装色の変更
段差改善ブロック

7 交通安全特定事業における基本的な整備内容

- ・交通規制の実施を推進します。
- ・横断歩道等では、標識・標示の視認性の確保を推進します。
- ・音響式信号機の設置に努めます。
- ・違法駐車取締りの強化を推進します。
- ・違法駐車防止に関する広報・啓発活動を推進します。

8 その他の事業について

(1) 駅前広場について

特定経路や準特定経路に接している駅前広場については、施設の整備状況や土地区画整理事業等を考慮し、利用しやすい施設の充実を目指し、バリアフリーを推進します。

■新たに整備する駅前広場

重点整備地区	事業主体	駅前広場	面積
鶴巻温泉駅周辺地区及び 東海大学前駅周辺地区	神奈川県	東海大学前駅南口広場	5,700m ²
	秦野市	鶴巻温泉駅南口広場	2,300m ²
渋沢駅周辺地区	秦野市	渋沢駅南口広場	3,000m ²

駅前広場の基本的な整備内容について

- ・身体障害者乗降用スペースを明示し、安全性の確保に努めます。

鶴巻温泉駅北口広場内①



鶴巻温泉駅北口広場内②



- ・既存施設の利用しやすさ、分かりやすさを向上させる整備を推進します。
- ・色や連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置を推進します。

鶴巻温泉駅北口広場内



- ・点字や文字の大きさに配慮したトイレなどの表示の改善を推進します。



- ・エレベーター、エスカレーター等の昇降機の設置を推進します。
- ・放置自転車等の排除に関する広報、啓発活動の充実を図ります。

(2) 主要準特定経路について

主要準特定経路とは、本来であれば特定経路として位置付け、「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」など主務省令等に定める基準に適合した整備を進める路線ですが、現時点では、地域の実情や地形的な状況などにより、2010年までに歩道等の構造を基準に適合することが難しいと考えられるため、諸事情を考慮しながら、可能な限りのバリアフリー化に努めようとする経路です。

■主要準特定経路の路線名

重点整備地区	事業主体	路線名	延長
秦野駅周辺地区	神奈川県	県道704号	675m
		県道705号	330m
	秦野市	市道322号線	60m
鶴巻温泉駅周辺地区及び 東海大学前駅周辺地区	神奈川県	県道612号	280m

(3) 準特定経路について

準特定経路とは、特定経路と同様な基準で選定していますが、2010年までに「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」など主務省令等に定める基準に適合した整備をすることが難しいと考えられるため、中長期的視点に立ち、既存施設の改善などを前提に可能な限り交通バリアフリー化に努めようとする経路です。

■準特定経路の路線名

重点整備地区	事業主体	路線名	延長
秦野駅周辺地区	神奈川県	県道705号	335m
	秦野市	市道342号線	225m
		市道354号線	148m
		市道650号線	120m
鶴巻温泉駅周辺地区及び 東海大学前駅周辺地区	神奈川県	県道612号	725m
		県道613号	790m
	秦野市	市道9号線	300m
		市道64号線	365m
		市道66号線	750m
		市道422号線	130m
		市道541号線	75m
		市道569号線	240m
渋沢駅周辺地区	神奈川県	県道707号	115m
		県道708号	540m
	秦野市	市道15号線	130m
		市道816号線	520m
		市道866号線	140m
		市道867号線	280m

第2章 各重点整備地区での事業内容

1 秦野駅周辺地区

秦野駅の南口駅前広場を含み北側の約0.51平方キロメートルの地区を重点整備地区に指定します。

秦野駅周辺地区は、地形的な面や市街地の規模においても本市の中心的市街地で、秦野駅北口から本町四ツ角周辺は中心的商業地となっています。

また、市役所を始め各種の公共公益施設も充実しています。

高齢者及び身体障害者等が、安全・安心、快適な移動を行えるよう、秦野駅から秦野市役所までの移動に利用する経路などのバリアフリー化を図ります。

(1) 公共交通特定事業計画の事業内容と実施予定年度

ア 鉄道に関すること

事業実施者	小田急電鉄株式会社 東京都新宿区西新宿1-8-3	
旅客施設の概要		
施設名：小田急小田原線 秦野駅	駅舎の種別：橋上駅舎	
所在地：神奈川県秦野市大秦町1-1		
電話番号：0463-81-1661		
事業の内容	実施予定期間	
	着手	完了
駅係員教育の拡充	着手済	平成16年度
新型券売機の導入及びカウンターの改修	平成19年度までに実施	
トイレ等施設の認知性の向上	平成22年度までに実施	
事業実施に際し配慮すべき重要事項	—	
駅構内図		

イ バスに関すること

事業実施者	神奈川中央交通株式会社 神奈川県平塚市八重咲町6-18
-------	--------------------------------

事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
超低床化バス車両の導入	毎年度 2 [両] 程度	平成15年度	平成22年度
バス停留所への上屋の設置など 待合施設の充実	毎年度 3 [棟] 程度	平成15年度	平成22年度
秦野駅への行き先案内板の設置	2 [基]	平成15年度	平成15年度
低床化バス車両の導入	102 [両]	平成15年度	平成22年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施に向け、各関係機関との調整が不可欠。 ・平成15年度以降の低床化バス車両の導入は現時点（H15.4.1）での乗合車両（122両）の内、ワンステップバス車両（20両）を差し引いた事業量であり、移籍等の理由による事業量の変更は有り得る。 		

(2) 路線別道路特定事業計画の事業内容と実施予定年度

ア 神奈川県

事業実施者	平塚土木事務所 神奈川県平塚市西八幡1-3-1
-------	----------------------------

① 県道704号			
事業区間（始点：秦野駅北口広場 終点：秦野橋北側交差点）			
延長（310）m			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道整備（新設）	40 [m]	平成15年度	平成15年度
電線共同溝（CCB）の整備	120 [m]	平成16年度	平成17年度
歩道巻込み部等の段差、こう配の改善	7 [箇所]	平成17年度	平成17年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	310 [m]	平成17年度	平成17年度
案内標識の設置	2 [箇所]	平成17年度	平成17年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	電線共同溝の整備に先立ち、各占用企業者との調整が必要。 歩道こう配の改善は、現場の状況に合わせ調整が必要。		

② 県道705号			
事業区間 (始点：秦野駅北口広場 終点：まほろば大橋の北側) 橋梁部分		延長 (50) m	
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
視覚障害者誘導用ブロックの設置	100 [m]	平成17年度	平成17年度
案内標識の設置	2 [箇所]	平成17年度	平成17年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	歩道形式はマウントアップであるが、幅員、こう配等は、構造基準を満たしており、また、橋梁部である事を考慮し特に改善を行わない。		

イ 秦野市

事業実施者	建設部道路整備課 神奈川県秦野市桜町1-3-2
-------	----------------------------

① 市道6号線			
事業区間 (始点：まほろば大橋 終点：秦野警察署交差点)		延長 (895) m	
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
セミフラット歩道の整備 (改善)	50 [m]	平成17年度	平成18年度
透水性舗装の整備	150 [m]	平成17年度	平成18年度
巻込み部の色付け	6 [箇所]	平成17年度	平成18年度
段差改善ブロックの設置	7 [箇所]	平成17年度	平成18年度
植樹柵改善による歩道有効幅員拡大	2 [箇所]	平成17年度	平成18年度
細目グレーチングの設置	5 [箇所]	平成17年度	平成18年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	573 [m]	平成17年度	平成18年度
案内標識の設置	2 [箇所]	平成17年度	平成18年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	秦野橋北側交差点においては、県道704号の整備と整合を図る。		


② 市道82号線			
事業区間 (始点：秦野駅北口広場内 終点：まほろば大橋)		延長 (208) m	
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
視覚障害者誘導用ブロックの設置	208 [m]	平成17年度	平成18年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	秦野駅北口広場と一体的な整備を図る。		

③ 市道650号線

事業区間 (始点:まほろば大橋 終点:常盤橋)
 延長 (482) m

事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道整備 (新設)	403 [m]	着手済	平成17年度
セミフラット歩道の整備 (改善)	30 [m]	平成17年度	平成17年度
透水性舗装の整備	30 [m]	平成17年度	平成17年度
電線共同溝 (CCB) の整備	403 [m]	着手済	平成17年度
巻込み部の色付け	2 [箇所]	平成17年度	平成17年度
段差改善ブロックの設置	2 [箇所]	平成17年度	平成17年度
細目グレーチングの設置	2 [箇所]	平成17年度	平成17年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	79 [m]	平成17年度	平成17年度
案内標識の設置	2 [箇所]	平成17年度	平成17年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	都市計画道路駅前水無川線街路築造事業により整備を図る。		

■ 秦野駅周辺地区道路特定事業計画

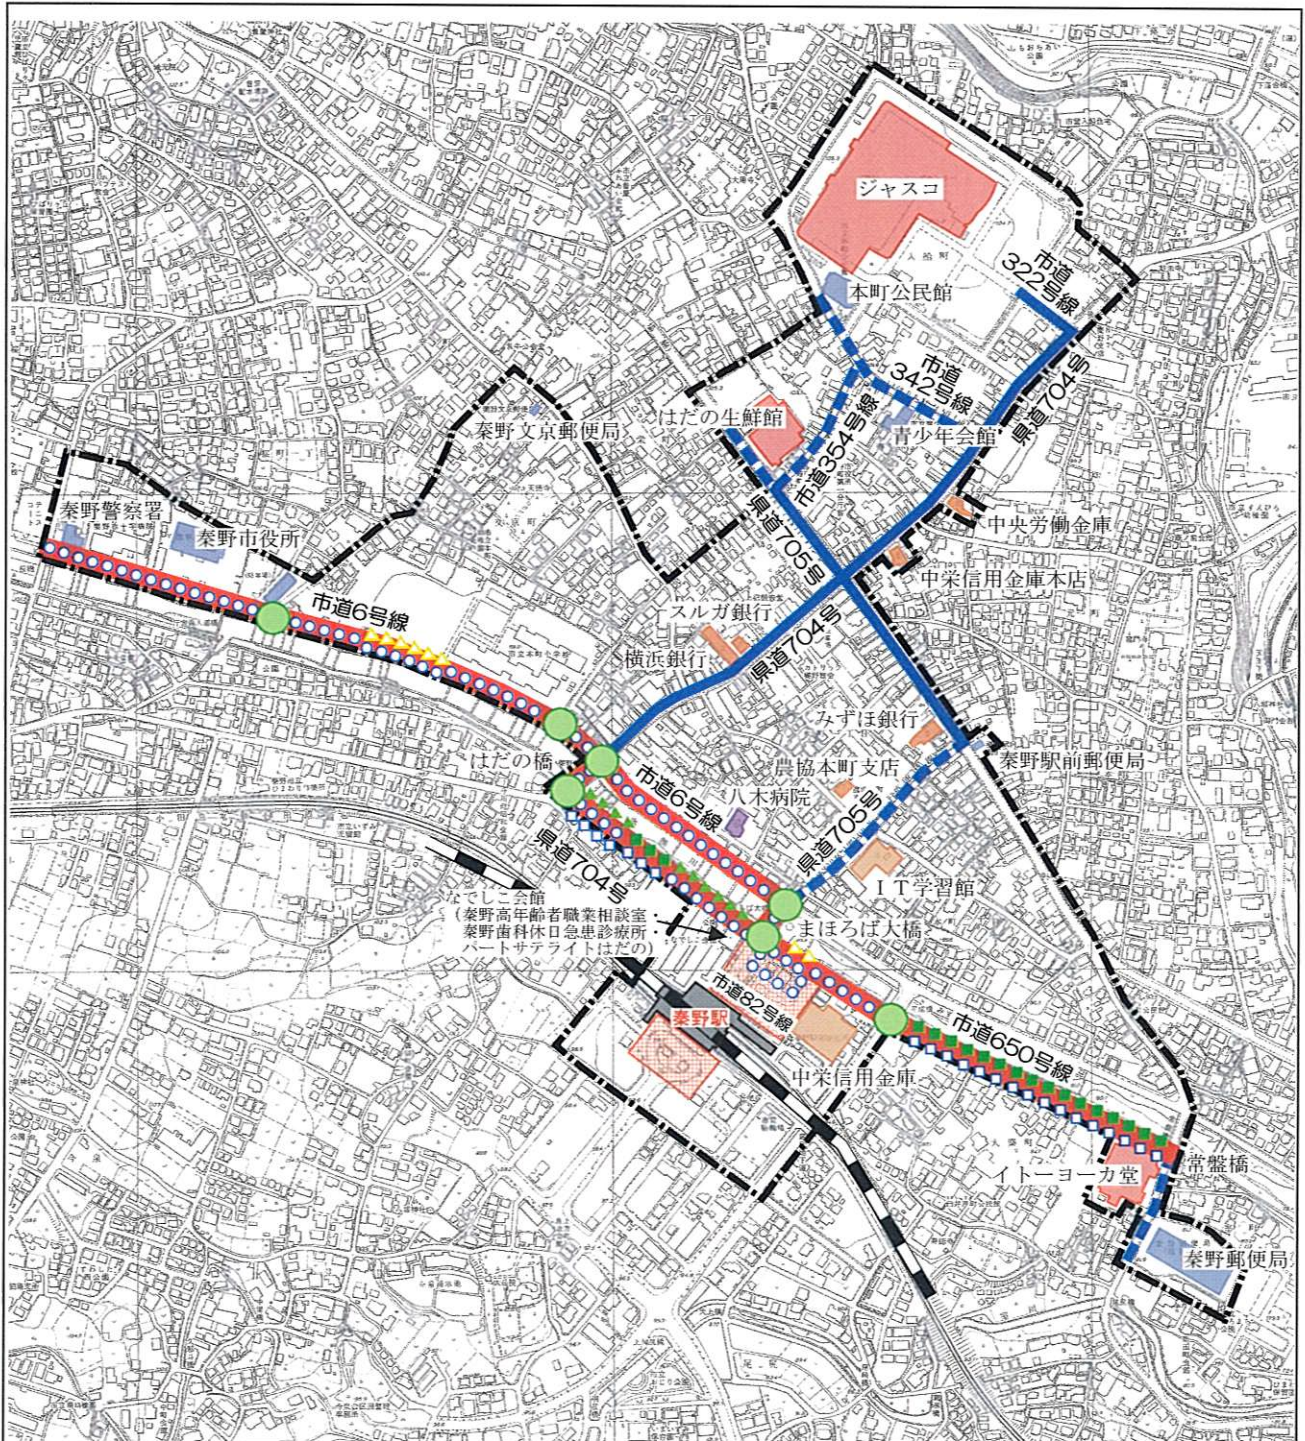

凡	重点整備地区	主要準特定経路	
	特定経路	準特定経路	
例	歩道整備	電線共同溝整備	視覚障害者誘導用ブロック設置
	交差点部の改良	段差・傾斜・勾配の改善	その他

■道路特定事業計画の事業内容及び実施予定年度

事業主体	路線名	事業内容	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
神奈川県	県道704号 (秦野駅北口広場 ～秦野橋北側交差点)	歩道整備(新設)	■■■							
		電線共同溝(CCB)の整備		■■■	■■■					
		歩道巻込み部等の段差、 こう配の改善			■■■					
		視覚障害者誘導用ブロックの設置			■■■					
		案内標識の設置			■■■					
		県道705号 (秦野駅北口広場 ～まほろば大橋の北側)	視覚障害者誘導用ブロックの設置			■■■				
		案内標識の設置			■■■					
秦野市	市道6号線 (まほろば大橋～秦野警察署交差点)	セミフラット歩道の整備(改善)			■■■	■■■				
		透水性舗装の整備			■■■	■■■				
		巻込み防止の色付け			■■■	■■■				
		段差改善ブロックの設置			■■■	■■■				
		植樹樹改善による歩道有効幅員拡大			■■■	■■■				
		細目グレーチングの設置			■■■	■■■				
		視覚障害者誘導用ブロックの設置			■■■	■■■				
		案内標識の設置			■■■	■■■				
	市道82号線(秦野駅北口広場内～まほろば大橋)	視覚障害者誘導用ブロックの設置			■■■	■■■				
	市道650号線 (まほろば大橋～常盤橋)	歩道整備(新設)	■■■	■■■	■■■					
		セミフラット歩道の整備(改善)			■■■					
		透水性舗装の整備			■■■					
		電線共同溝の整備	■■■	■■■	■■■					
		巻込み防止の色付け			■■■					
		段差改善ブロックの設置			■■■					
細目グレーチングの設置				■■■						
視覚障害者誘導用ブロックの設置				■■■						
		案内標識の設置			■■■					

(3) 交通安全特定事業の事業内容と実施予定年度

事業実施者		神奈川県公安委員会 神奈川県横浜市中区海岸通2-4			
路線名	事業実施箇所	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
				着手	完了
県道 704 号	秦野橋北・南側 交差点	横断歩道標示の 高輝度化	2 [箇所]	平成15年度	平成16年度
県道 705 号	まほろば大橋北・ 南側交差点	横断歩道標示の 高輝度化	2 [箇所]	平成15年度	平成16年度
市道 6 号線	秦野警察署前交差 点・市役所前	横断歩道標示の 高輝度化	2 [箇所]	平成15年度	平成15年度
		標識の高輝度化	1 [式]	平成15年度	平成15年度
	秦野橋北側交差点 ～まほろば大橋	横断歩道整備	1 [箇所]	平成15年度	平成16年度
市道 82 号線	秦野駅北口広場～ まほろば大橋	標識・標示の高 輝度化	1 [式]	平成17年度	平成18年度
市道 650 号線	まほろば大橋～常 磐橋	横断歩道標示の 高輝度化	2 [箇所]	平成17年度	平成17年度
		標識の高輝度化	1 [式]	平成17年度	平成17年度
		横断歩道整備	2 [箇所]	平成15年度	平成16年度

(4) その他の事業内容と実施予定年度

1) 駅前広場に関する事業計画 (秦野駅)

秦野駅の南北駅前広場は、既存施設を活用し、高齢者や身体障害者等の利便性の向上のため、視覚障害者誘導用ブロック設置などバリアフリー化を推進します。

① 秦野駅北口広場

事業実施者		建設部建設管理課 神奈川県秦野市桜町1-3-2		
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間		
		着手	完了	
駅前広場案内設備の設置	2 [箇所]	平成17年度	平成18年度	
視覚障害者誘導用ブロックの設置	110 [m]	平成17年度	平成18年度	
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	駅前広場案内設備の設置においては、公共交通特定事業との整合を図る。			

② 秦野駅南口広場

事業実施者	建設部建設管理課 神奈川県秦野市桜町1-3-2
-------	----------------------------

事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
タクシー乗り場の歩道切下げ等改善	1 [箇所]	平成17年度	平成18年度
駅前広場案内設備の設置	2 [箇所]	平成17年度	平成18年度
身体障害者乗降用スペースまでの誘導案内表示	2 [箇所]	平成17年度	平成18年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	駅前広場案内設備の設置においては、公共交通特定事業との整合を図る。		

2) 公衆便所に関する事業計画 (秦野駅)

① 秦野駅北口公衆便所

事業実施者	環境農政部 環境衛生課 神奈川県秦野市桜町1-3-2
-------	-------------------------------

事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
案内表示板の設置	1 [基]	平成15年度	平成15年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	平成15年度	平成16年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	<p>既存の機能を活かした上で、利用しやすさ、認知性の向上を図る。</p> <p>案内表示板の設置は交通事業者と連携を図るとともに、視覚障害者誘導用ブロックの設置については駅前広場管理者、ビル所有者との調整が必要。</p>		

② 秦野駅南口公衆便所

事業実施者	環境農政部 環境衛生課 神奈川県秦野市桜町1-3-2
-------	-------------------------------

事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
案内表示板の設置	1 [基]	平成15年度	平成15年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	<p>既存の機能を活かした上で、利用しやすさ、認知性の向上を図る。</p> <p>案内表示板の設置は交通事業者との連携が必要。</p>		

3) 主要準特定経路に関する事業計画

主要準特定経路に位置付けられた経路は、地域の実情や地形的な状況等を考慮しながら可能な限りバリアフリー化を推進します。

ア 神奈川県

事業実施者	平塚土木事務所 神奈川県平塚市西八幡1-3-1
-------	----------------------------

① 県道704号			
事業区間 (始点: 秦野橋 終点: ジャスコ入口)			
延長 (675) m			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道巻込み部等の段差、こう配の改善	675 (1350) [m]	平成15年度	平成18年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	歩道こう配等の改善は現場の状況に合わせ調整が必要。		

② 県道705号			
事業区間 (始点: 秦野駅前郵便局 終点: はだの生鮮館前)			
延長 (330) m (200mは改善完了)			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道巻込み部等の段差、こう配の改善	130 (260) [m]	平成19年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	歩道こう配等の改善は現場の状況に合わせ調整が必要。		

イ 秦野市

事業実施者	建設部道路整備課 神奈川県秦野市桜町1-3-2
-------	----------------------------

① 市道322号線			
事業区間 (始点: 県道704号 終点: ジャスコ入口前)			
延長 (60) m			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道整備 (改善)	60 [m]	平成17年度	平成17年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	—		

■その他の事業内容及び実施予定年度

事業主体	事業箇所	事業内容	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
秦野市	秦野駅 北口広場	駅前広場案内設備の設置			■■■	■■■				
		視覚障害者誘導用ブロックの設置			■■■	■■■				
	秦野駅北口 公衆便所	案内表示版の設置	■■■							
		視覚障害者誘導用ブロックの設置	■■■	■■■						
	秦野駅 南口広場	タクシー乗り場の歩道切 下げ改善				■■■	■■■			
		駅前広場案内設備の設置				■■■	■■■			
視覚障害者誘導用ブロックの設置					■■■	■■■				
秦野駅南口 公衆便所	案内表示版の設置	■■■								

事業主体	路線名	事業内容	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
神奈川県	県道704号(秦 野橋~ジャスコ入 口)	歩道巻込み部等の 段差、こう配の改 善	■■■	■■■	■■■	■■■				
	県道705号(秦 野駅前郵便局~は だの生鮮館前)	歩道巻込み部等の 段差、こう配の改 善					■■■			
秦野市	市道322号線 (県道704号~ジ ヤスコ入口前)	歩道整備(改善)			■■■					

2 鶴巻温泉駅周辺地区及び東海大学前駅周辺地区

2-1 鶴巻温泉駅周辺地区

鶴巻温泉駅と東海大学前駅は、駅の間隔が約1キロメートルと近いいため、両駅周辺を県道612号及び県道613号で結ぶようにして約1.07平方キロメートルの地区を重点整備地区に指定します。

この地区は市の最も東側に位置し、秦野盆地の外にある地区で、駅を中心とした2つの駅勢圏はそれぞれ違う特徴を持っています。

鶴巻温泉駅周辺は、地域住民への商業等の機能を持った拠点であると同時に温泉という地域特性をもち、温泉施設や介護療養型医療施設などがあります。

高齢者及び身体障害者等が、安全・安心、快適な移動を行えるよう、鶴巻温泉駅から弘法の里湯までの移動に利用する経路などのバリアフリー化を図ります。


(1) 公共交通特定事業計画の事業内容と実施予定年度

ア 鉄道に関すること

事業実施者	小田急電鉄株式会社 東京都新宿区西新宿1-8-3
-------	-----------------------------

旅客施設の概要		
施設名：小田急小田原線 鶴巻温泉駅	駅舎の種別：地上駅舎	
所在地：神奈川県秦野市鶴巻北2-1-1		
電話番号：0463-77-1665		
事業の内容	実施予定期間	
	着手	完了
駅係員教育の拡充	着手済	平成16年度
新型券売機の導入及びカウンターの改修	平成19年度までに実施	
エレベーターの設置	平成22年度までに実施	
トイレ等施設の認知性の向上	平成22年度までに実施	
事業実施に際し配慮すべき重要事項	駅舎外の整備との整合性 ・鶴巻温泉駅南口駅前広場の整備に関する事業	

駅構内図

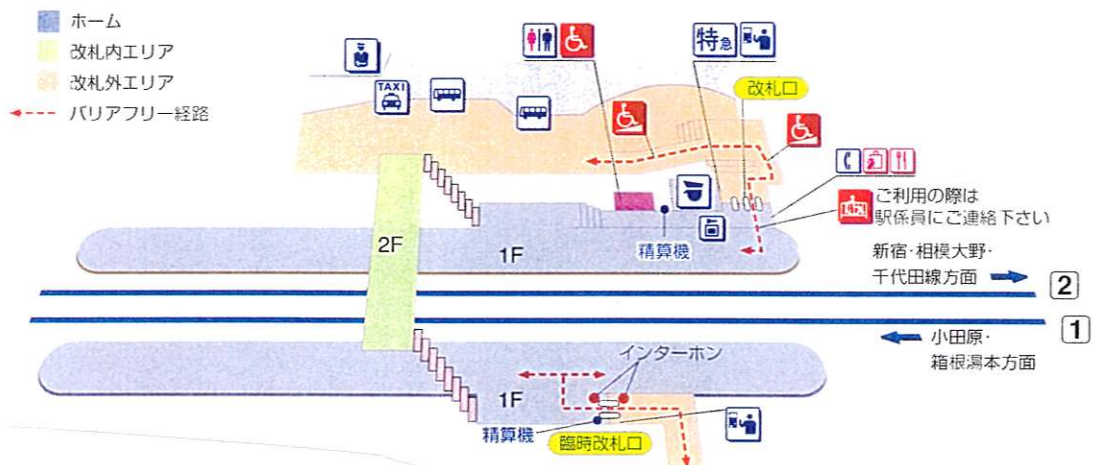

イ バスに関すること

事業実施者	神奈川中央交通株式会社 神奈川県平塚市八重咲町 6-18		
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
超低床化バス車両の導入	毎年度 2 [両] 程度	平成 15 年度	平成 22 年度
バス停留所への上屋の設置など 待合施設の充実	毎年度 3 [棟] 程度	平成 15 年度	平成 22 年度
低床化バス車両の導入	102 [両]	平成 15 年度	平成 22 年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施に向け、各関係機関との調整が不可欠。 ・平成 15 年度以降の低床化バス車両の導入は現時点 (H15.4.1) での乗合車両 (122 両) の内、ワンステップバス車両 (20 両) を差し引いた事業量であり、移籍等の理由による事業量の変更は有り得る。 		

(2) 路線別道路特定事業計画の事業内容と実施予定年度

ア 神奈川県

事業実施者	平塚土木事務所 神奈川県平塚市西八幡 1-3-1		
① 県道 612 号			
事業区間 (始点: 鶴巻温泉駅踏切 終点: 鶴巻会館前交差点)			
延長 (350) m			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道整備 (新設)	350 (600) [m]	平成 15 年度	平成 22 年度
電線共同溝 (CCB) の整備	350 (600) [m]	平成 20 年度	平成 22 年度
案内標識の設置	2 [箇所]	平成 20 年度	平成 22 年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	<p>都市計画道路整備で、地権者の事業協力が不可欠である。また、周辺住民による「まちづくり協議会」が発足しており調整が必要。</p> <p>文化財包蔵地に指定されており、発掘調査が必要。</p>		

イ 秦野市



事業実施者	建設部道路整備課 神奈川県秦野市桜町1-3-2
-------	----------------------------

① 市道 8 号線			
事業区間 (始点：鶴巻温泉駅北口広場 終点：鶴巻温泉駅入口交差点)			
延 長 (600) m			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
細目グレーチングの設置	4 [箇所]	平成19年度	平成20年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	600 (1200) [m]	平成19年度	平成20年度
案内標識の設置	2 [箇所]	平成19年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	温泉という地域特性に配慮した整備に努める。		

② 市道411号線			
事業区間 (始点：鶴巻温泉駅入口交差点 終点：鶴巻公民館)			
延 長 (90) m			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道整備 (新設)	20 [m]	平成19年度	平成20年度
巻込み部の色付け	2 [箇所]	平成19年度	平成20年度
段差改善ブロックの設置	2 [箇所]	平成19年度	平成20年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	90 [m]	平成19年度	平成20年度
案内標識の設置	1 [箇所]	平成19年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	歩道設置に伴い道路線形の変更を検討する。		

③ 市道418号線			
事業区間 (始点：鶴巻温泉駅北口広場 終点：弘法の里湯)			
延 長 (100) m			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
視覚障害者誘導用ブロックの設置	100 [m]	平成19年度	平成20年度
案内標識の設置	1 [箇所]	平成19年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき 事項	温泉という地域特性に配慮した整備に努める。		

■ 鶴巻温泉駅周辺地区道路特定事業計画

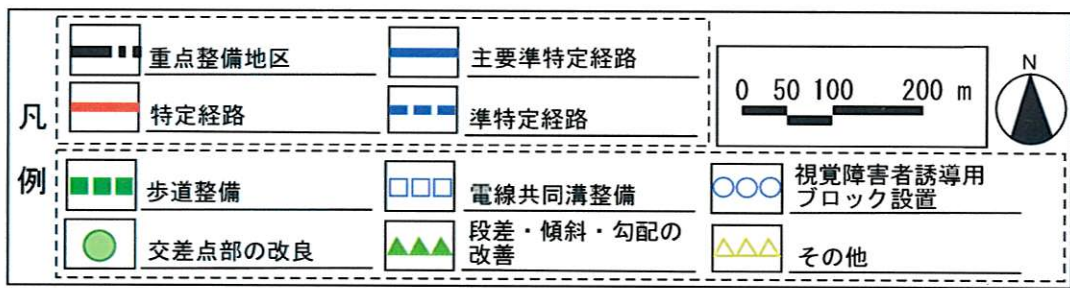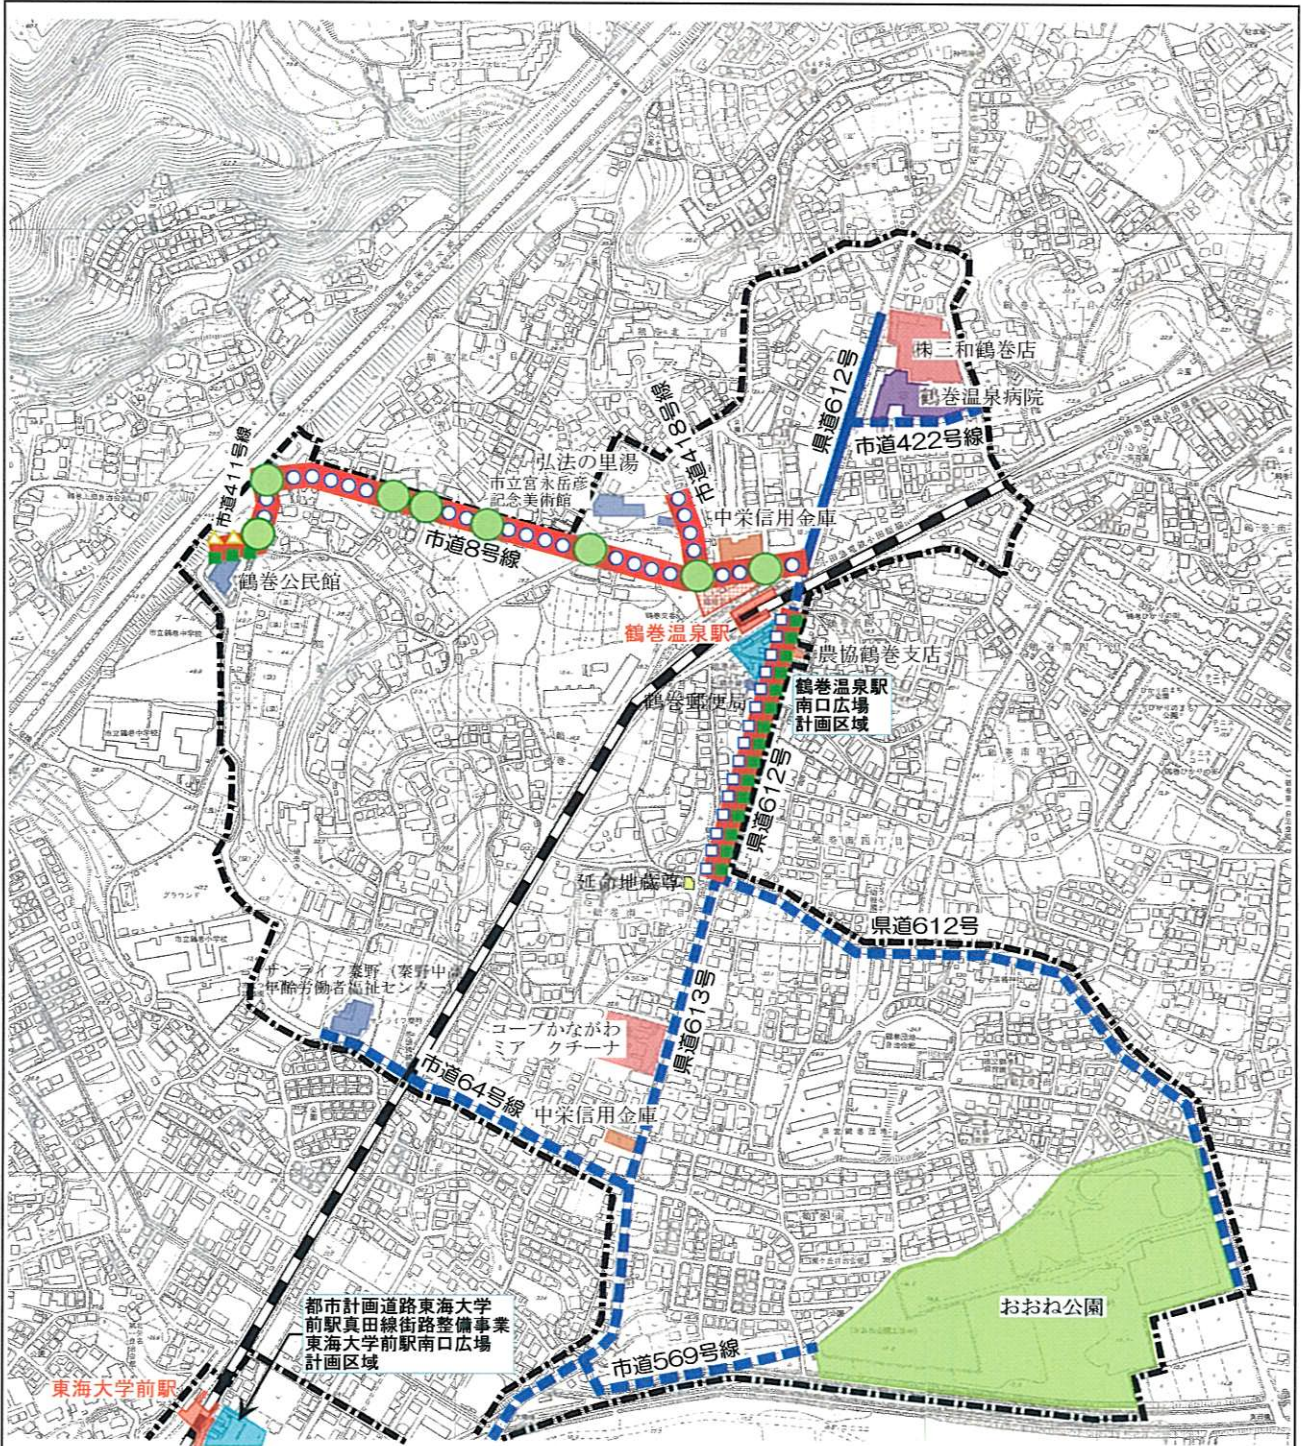

■道路特定事業計画の事業内容及び実施予定年度

事業主体	路線名	事業内容	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
神奈川県	県道612号(鶴巻温泉駅踏切～鶴巻会館前交差点)	歩道整備(新設)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
秦野市	市道8号線 (鶴巻温泉駅北口広場～鶴巻公民館入口交差点)	細目グレーチングの設置					■ ■ ■	■ ■ ■		
		視覚障害者誘導用ブロックの設置					■ ■ ■	■ ■ ■		
		案内標識の設置					■ ■ ■	■ ■ ■		
	市道411号線 (鶴巻温泉駅入口交差点～鶴巻公民館)	歩道整備(新設)					■ ■ ■	■ ■ ■		
		巻込み防止の色付け					■ ■ ■	■ ■ ■		
		段差改善ブロックの設置					■ ■ ■	■ ■ ■		
		視覚障害者誘導用ブロックの設置					■ ■ ■	■ ■ ■		
		案内標識の設置					■ ■ ■	■ ■ ■		
市道418号線 (鶴巻温泉駅北口広場～弘法の里湯)	視覚障害者誘導用ブロックの設置					■ ■ ■	■ ■ ■			
	案内標識の設置					■ ■ ■	■ ■ ■			

(3)交通安全特定事業の事業内容及び実施予定年度

事業実施者	神奈川県公安委員会 神奈川県横浜市中区海岸通2-4
-------	------------------------------

路線名	事業実施箇所	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
				着手	完了
県道612号	鶴巻温泉駅南側入口交差点	横断歩道整備	1 [箇所]	平成21年度	平成22年度
市道8号線	鶴巻温泉駅北口広場～鶴巻温泉駅入口交差点	横断歩道標示の高輝度化	6 [箇所]	平成16年度	平成16年度
		標識の高輝度化	1 [式]	平成16年度	平成16年度
市道411号線	鶴巻温泉駅入口交差点～鶴巻公民館	横断歩道標示の高輝度化	2 [箇所]	平成16年度	平成16年度
		標識の高輝度化	1 [式]	平成16年度	平成16年度
市道418号線	弘法の里湯前	標識の高輝度化	1 [式]	平成16年度	平成16年度

(4) その他の事業内容と実施予定年度

1) 駅前広場に関する事業計画（鶴巻温泉駅）

鶴巻温泉駅北口広場は、駅舎の改築等も視野に入れ、公共交通特定事業との整合を図りつつ、視覚障害者誘導用ブロックの設置などバリアフリー化を推進します。

南口駅前広場は、県道612号の整備及び鶴巻温泉駅南口周辺地区環境創出推進地区基本計画（平成15年策定予定）との整合を図りながら整備に努めます。

① 鶴巻温泉駅北口広場

事業実施者		建設部建設管理課 神奈川県秦野市桜町1-3-2	
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道切下げ部の改善	1 [箇所]	平成19年度	平成20年度
駅前広場案内設備の設置	1 [箇所]	平成19年度	平成20年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	115 [m]	平成19年度	平成20年度
階段手すり端部への点字表示	8 [箇所]	平成19年度	平成20年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	駅舎の改築なども視野に入れ、公共交通特定事業との整合を図る。		

② 鶴巻温泉駅南口広場

事業実施者		建設部道路整備課 神奈川県秦野市桜町1-3-2	
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
駅前広場の整備	—	平成18年度	平成22年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	—		

2) 公衆便所に関する事業計画（鶴巻温泉駅）

① 鶴巻温泉駅北口公衆便所

事業実施者		環境農政部 環境衛生課 神奈川県秦野市桜町1-3-2	
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
案内表示板の設置	1 [基]	平成15年度	平成15年度
身障者トイレ入口ドア構造等の改善	1 [箇所]	平成15年度	平成15年度
トイレ前の段差改善	1 [箇所]	平成15年度	平成16年度
事業実施に際し配慮すべき重要事項	既存の機能を活かした上で、利用しやすさ、認知性の向上を図る。整備に当たっては、交通事業者や駅前広場管理者との調整が必要。		

3) 主要準特定経路に関する事業計画

主要準特定経路に位置付けられた経路は、地域の実情や地形的な状況等を考慮しながらバリアフリー化を推進します。

ア 神奈川県

事業実施者	平塚土木事務所 神奈川県平塚市西八幡1-3-1
-------	----------------------------

① 県道612号			
事業区間 (始点：鶴巻温泉駅 終点：鶴巻温泉病院先)			
延長 (280) m			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道巻込み部等の段差、こう配の改善	280(560) [m]	平成19年度	平成21年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	歩道こう配等の改善は現場の状況に合わせて調整が必要。		

■その他の事業内容及び実施予定年度

事業主体	事業箇所	事業内容	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
秦野市	鶴巻温泉駅 北口広場	歩道切下げ部の改善					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		
		駅前広場案内設備の設置					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		
		視覚障害者誘導用ブロックの設置					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		
		階段手すり端部への点字表示					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		
	鶴巻温泉駅 北口公衆 便所	既存トイレの改修(案内表示板の設置、入口ドア、段差の改善)	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						
鶴巻温泉駅 南口広場	駅前広場の整備		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	

事業主体	路線名	事業内容	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
神奈川県	県道612号 (鶴巻温泉駅~ 鶴巻温泉病院先)	歩道巻込み部等の段差、こう配の改善					■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	

2-2 東海大学前駅周辺地区

鶴巻温泉駅と東海大学前駅は、駅の間隔が約1キロメートルと近いとため、両駅周辺を県道612号及び県道613号で結ぶようにして約1.07平方キロメートルの地区を重点整備地区に指定します。

この地区は市の最も東側に位置し、秦野盆地の外にある地区で、駅を中心とした2つの駅勢圏はそれぞれ違う特徴を持っています。

東海大学前駅は学生の利用が多く、駅周辺は地域の生活拠点であると同時に、飲食や娯楽を通じた交流機能、文化機能が育つ可能性をもっています。

高齢者及び身体障害者等が、安全・安心、快適な移動を行えるよう、東海大学前駅から大規模店舗までの移動に利用する経路などのバリアフリー化を図ります。

(1) 公共交通特定事業計画の事業内容と実施予定年度

ア 鉄道に関すること

事業実施者	小田急電鉄株式会社 東京都新宿区西新宿1-8-3
--------------	-----------------------------

旅客施設の概要


施設名：小田急小田原線 東海大学前駅	駅舎の種別：地上駅舎
所在地：神奈川県秦野市南矢名1-1-1	
電話番号：0463-77-1527	

事業の内容	実施予定期間	
	着手	完了
駅係員教育の拡充	着手済	平成16年度
新型券売機の導入及びカウンターの改修	平成19年度までに実施	
エレベーターの設置	平成22年度までに実施	
トイレ等施設の認知性の向上	平成22年度までに実施	

事業実施に際し配慮すべき重要事項

神奈川県が実施する「都市計画道路東海大学前駅真田線街路整備事業」に伴う駅舎外の整備と合わせて実施。

駅構内図

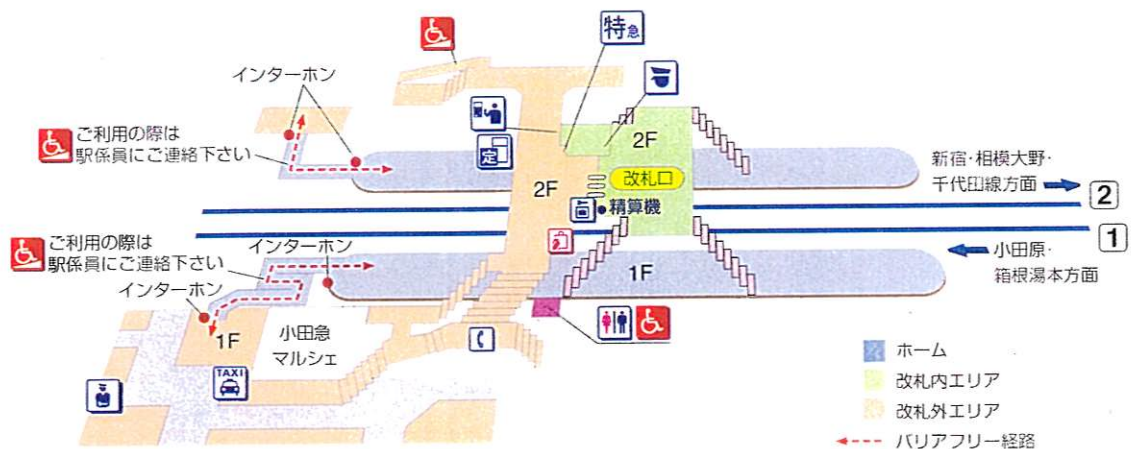

イ バスに関すること


事業実施者	神奈川中央交通株式会社 神奈川県平塚市八重咲町 6-18		
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
超低床化バス車両の導入	毎年度 2 [両] 程度	平成 1 5 年度	平成 2 2 年度
バス停留所への上屋の設置など 待合施設の充実	毎年度 3 [棟] 程度	平成 1 5 年度	平成 2 2 年度
低床化バス車両の導入	1 0 2 [両]	平成 1 5 年度	平成 2 2 年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施に向け、各関係機関との調整が不可欠。 ・平成 15 年度以降の低床化バス車両の導入は現時点 (H 15. 4. 1) での乗合車両 (122 両) の内、ワンステップバス車両 (20 両) を差し引いた事業量であり、移籍等の理由による事業量の変更は有り得る。 		

(2) 路線別道路特定事業計画の事業内容と実施予定年度

ア 神奈川県

事業実施者	平塚土木事務所 神奈川県平塚市西八幡 1-3-1		
① 県道 614 号			
事業区間 (始点: 東海大学前駅 終点: 東海大学前駅入口交差点)			
延 長 (3 0 0) m			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道整備 (新設)	130 (260) [m]	平成 1 5 年度	平成 1 9 年度
電線共同溝 (CCB) の整備	130 (260) [m]	平成 1 6 年度	平成 1 9 年度
歩道巻込み部等の段差、こう配の改善	6 [箇所]	平成 2 0 年度	平成 2 2 年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	272 [m]	平成 2 0 年度	平成 2 2 年度
照明施設の設置	130 [m]	平成 1 6 年度	平成 1 9 年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	電線共同溝の整備に先立ち、各占用企業者との調整が必要。歩道こう配等の改善は、現場の状況にあわせ調整が必要。		

■ 東海大学前駅周辺地区道路特定事業計画

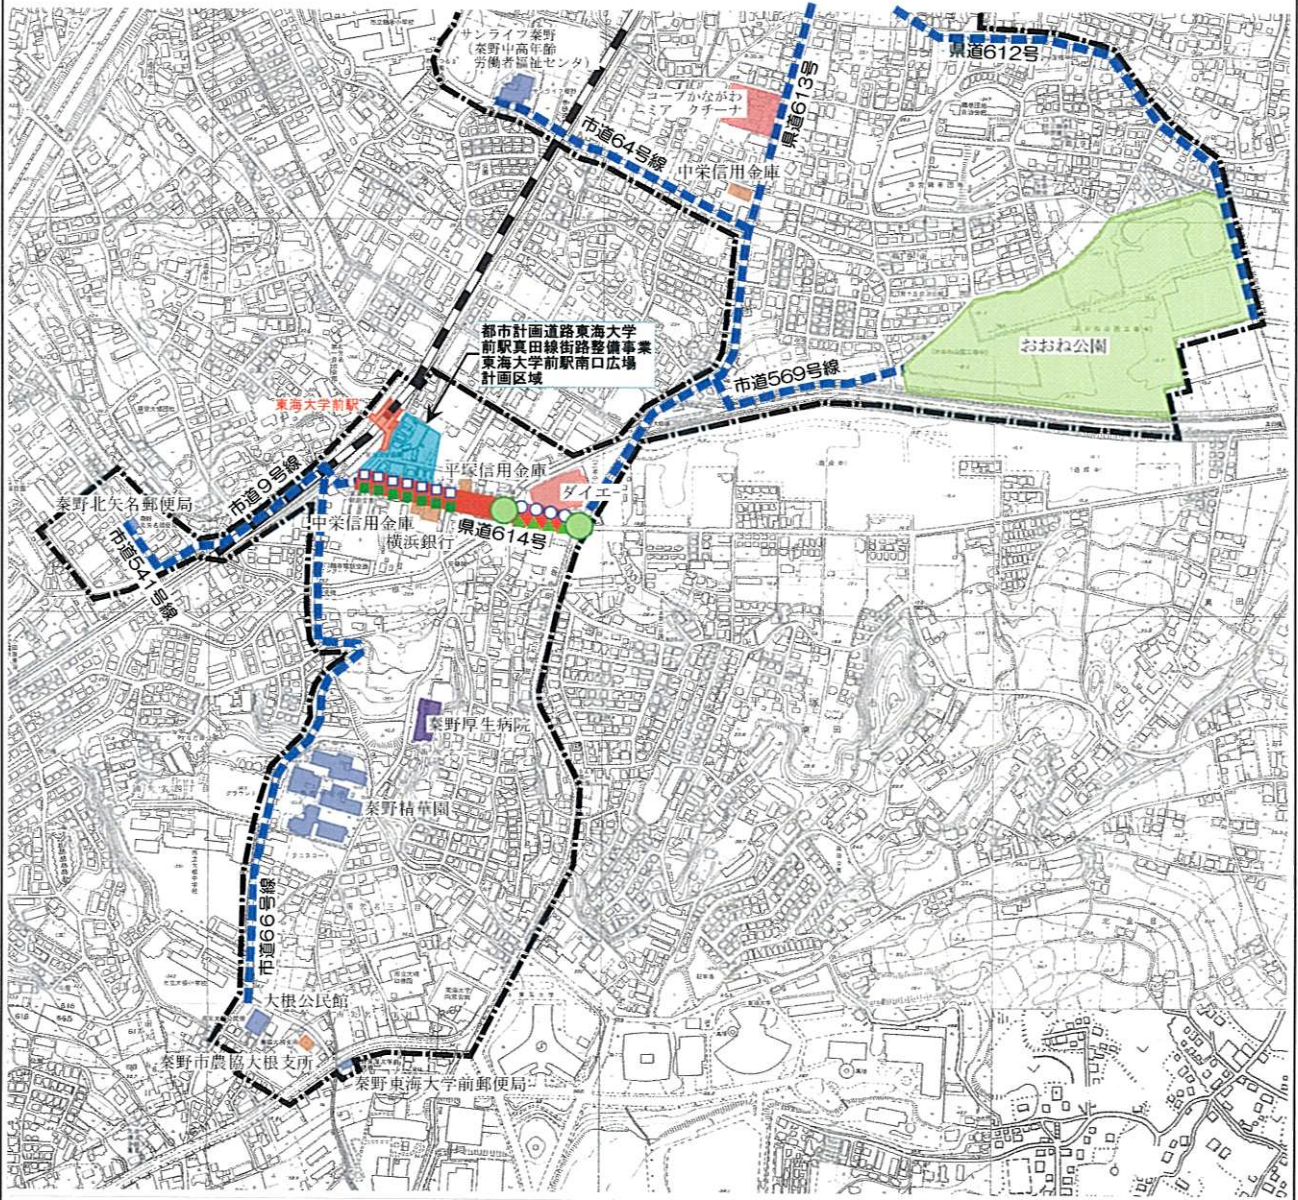

■道路特定事業計画の事業内容及び実施予定年度

事業主体	路線名	事業内容	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	
神奈川県	県道614号(東海大学前駅～東海大学前駅入口交差点)	歩道整備(新設)	■	■	■	■	■				
		電線共同溝(CCB)の整備		■	■	■	■				
		歩道巻込み部等の段差、こう配の改善						■	■	■	■
		視覚障害者誘導用ブロックの設置						■	■	■	■
		照明施設の設置		■	■	■	■	■			

(3) 交通安全特定事業の事業内容と実施予定年度

事業実施者	神奈川県公安委員会 神奈川県横浜市中区海岸通2-4
-------	------------------------------

路線名	事業実施箇所	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
				着手	完了
県道614号	鴨橋際交差点	横断歩道整備	4 [箇所]	平成21年度	平成22年度
	東海大学駅～東海大学前入口交差点	標識の高輝度化	1 [式]	平成21年度	平成22年度

(4) その他の事業内容と実施予定年度

1) 駅前広場に関する事業計画（東海大学前駅）

東海大学前駅南口駅前広場は、公共交通特定事業が実施する整備と整合を図りつつ、エレベーター、エスカレーターを設置などバリアフリー化を推進します。

北口広場は、南口広場の整備、公共交通特定事業者が実施する整備との整合を図りつつ、視覚障害者誘導用ブロックの設置などバリアフリー化を推進します。


① 東海大学前駅北口広場

事業実施者	建設部建設管理課 神奈川県秦野市桜町1-3-2		
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
エレベーターの設置	1 [箇所]	平成18年度	平成19年度
駅前広場案内設備の設置	1 [箇所]	平成18年度	平成19年度
階段の手すり改善	4 [箇所]	平成18年度	平成19年度
階段手すり端部への点字表示	4 [箇所]	平成18年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	東海大学前駅南口広場の整備、公共交通事業者が実施する 整備との整合を図る。		


② 東海大学前駅南口広場

事業実施者	平塚土木事務所 神奈川県平塚市西八幡1-3-1		
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
駅前広場の整備	5,700 [㎡]	着手済	平成19年度
駅前広場案内設備の設置	1 [箇所]	平成18年度	平成19年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	平成17年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	東海大学前駅北口広場の整備、公共交通事業者が実施する 整備との整合を図る。		

■東海大学前駅南口広場の整備イメージ①

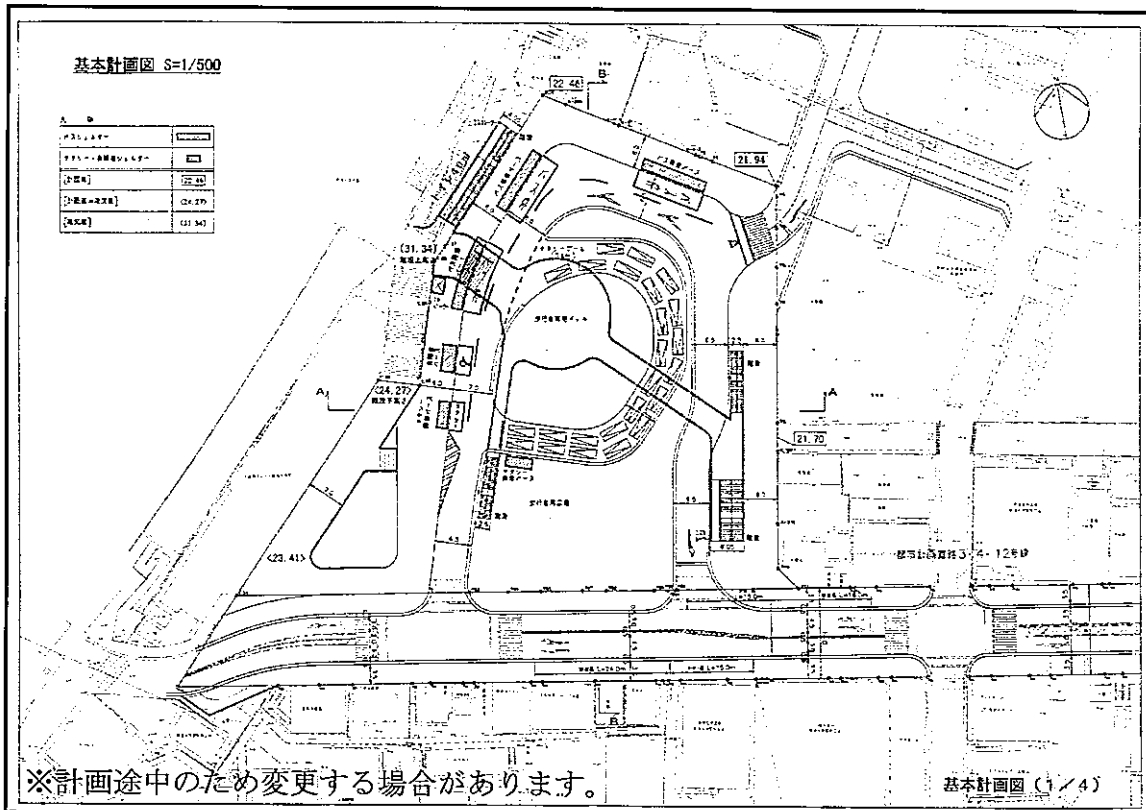

■東海大学前駅南口広場の整備イメージ②

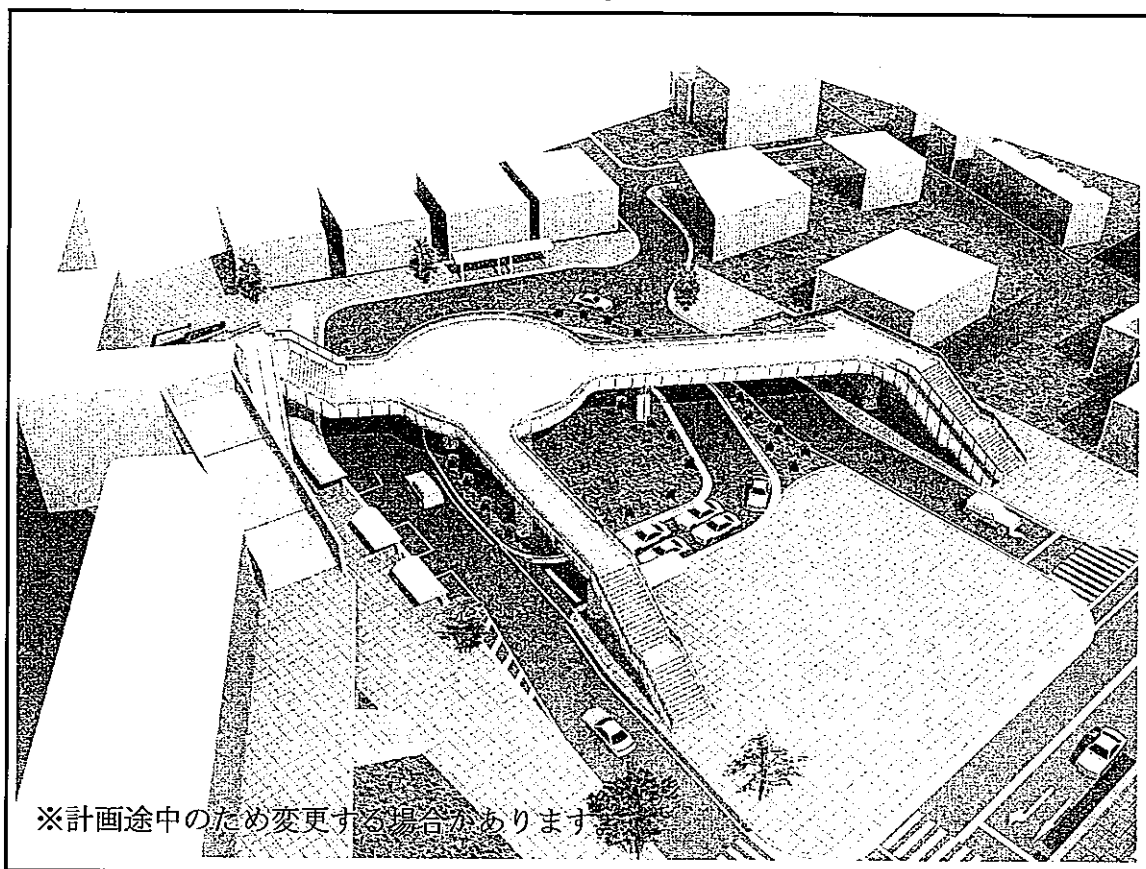

2) 公衆便所に関する事業計画（東海大学前駅）

① 東海大学前駅南口公衆便所

事業実施者	環境農政部 環境衛生課 神奈川県秦野市桜町1-3-2		
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
多機能トイレの設置	1 [箇所]	平成16年度	平成19年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	神奈川県が実施する「都市計画道路東海大学前駅真田線街路整備事業」に伴う南口広場の整備に合わせて、高齢者、身体障害者のみならずオストメイトの使用に配慮した多機能トイレを設置。		

■ その他の事業内容及び実施予定年度

事業主体	事業箇所	事業内容	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
神奈川県	東海大学前駅 南口広場	駅前広場の整備	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■			
		駅前案内設備の設置				■■■	■■■			
		視覚障害者誘導用ブロックの設置			■■■	■■■	■■■			
秦野市	東海大学前駅 南口公衆便所	多機能トイレの設置		■■■	■■■	■■■	■■■			
秦野市	東海大学前駅 北口広場	エレベーターの設置				■■■	■■■			
		駅前広場案内設備の設置				■■■	■■■			
		階段の手すり改善				■■■	■■■			
		階段手すり端部への点字表示				■■■	■■■			

3 渋沢駅周辺地区

渋沢駅南口の土地区画整理事業の区域を含み、約0.54平方キロメートルの地区を重点整備地区に指定します。

渋沢駅周辺には、各種の商業・業務施設が立地しており市西部の生活拠点となっています。


(1) 公共交通特定事業計画の事業内容と実施予定年度

ア 鉄道に関すること

事業実施者	小田急電鉄株式会社 東京都新宿区西新宿1-8-3
-------	-----------------------------

旅客施設の概要		
施設名：小田急小田原線 渋沢駅	駅舎の種別：地上駅舎	
所在地：神奈川県秦野市曲松1-1-1		
電話番号：0463-88-0272		
事業の内容	実施予定期間	
	着手	完了
駅係員教育の拡充	着手済	平成16年度
エレベーターの設置	平成15年度	平成15年度
新型券売機の導入及びカウンターの改修	平成19年度までに実施	
トイレ等施設の認知性の向上	平成22年度までに実施	
事業実施に際し配慮すべき重要事項	渋沢駅周辺[南口工区]土地区画整理事業に伴う駅舎外の整備と合わせて実施。	

駅構内図

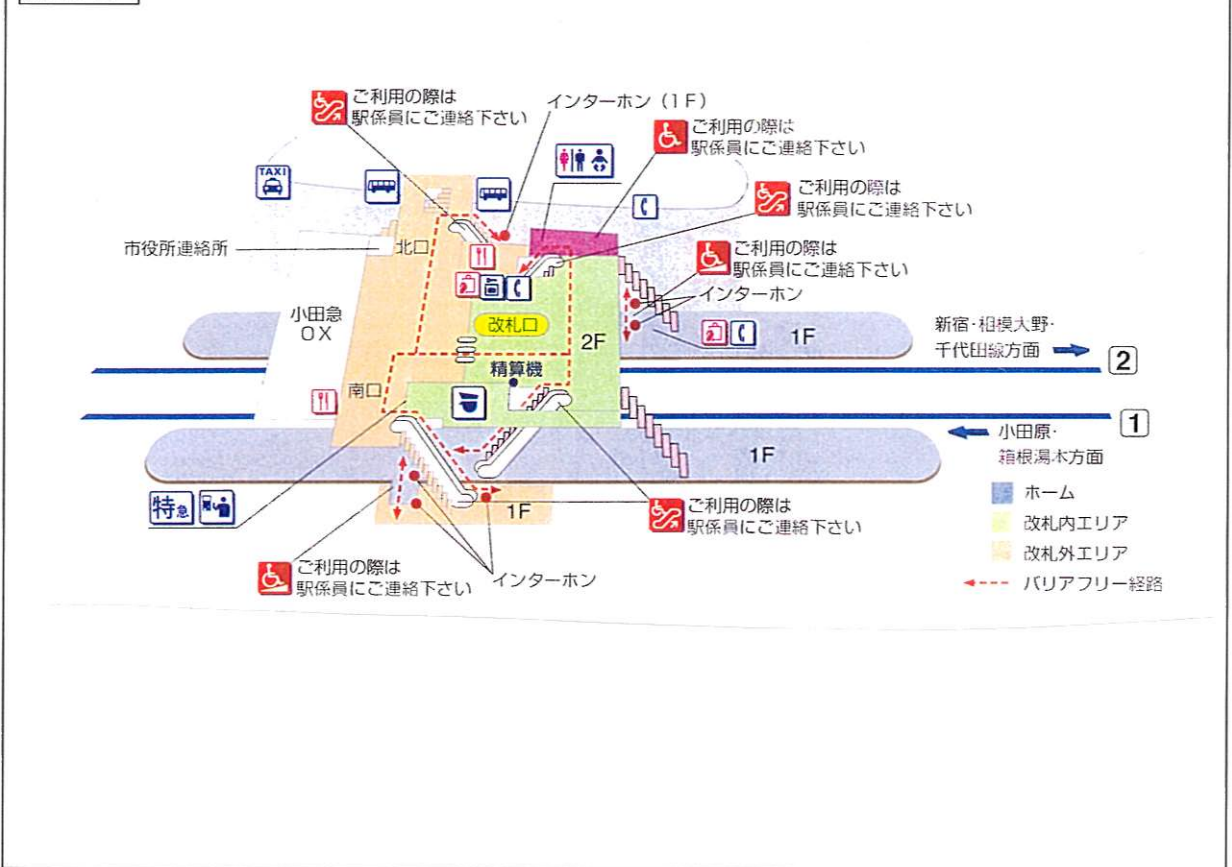

イ バスに関すること

事業実施者	神奈川中央交通株式会社 神奈川県平塚市八重咲町 6-18		
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
超低床化バス車両の導入	毎年度 2 [両] 程度	平成 15 年度	平成 22 年度
バス停留所への上屋の設置など 待合施設の充実	毎年度 3 [棟] 程度	平成 15 年度	平成 22 年度
渋沢駅への行き先案内板の設置	2 [基]	平成 15 年度	平成 15 年度
低床化バス車両の導入	102 [両]	平成 15 年度	平成 22 年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施に向け、各関係機関との調整が不可欠。 ・平成 15 年度以降の低床化バス車両の導入は現時点 (H 15.4.1) での乗合車両 (122 両) の内、ワンステップバス車両 (20 両) を差し引いた事業量であり、移籍等の理由による事業量の変更は有り得る。 		

(2) 路線別道路特定事業計画の事業内容と実施予定年度

ア 国土交通省

事業実施者	関東地方整備局横浜国道事務所厚木出張所 神奈川県厚木市恩名 456-1		
① 国道 246 号			
事業区間 (始点：曲松交差点 終点：柳町交差点) 延長 (560) m			
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
透水性舗装による歩道整備 (拡幅)	1,120 [m]	平成 15 年度	平成 17 年度
段差・傾斜・こう配の改善	1,120 [m]	平成 15 年度	平成 17 年度
電線共同溝整備 (渋沢駅入口交差点～市道 860 号線交差点)	280 [m] (上り線)	平成 15 年度	平成 17 年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,120 [m]	平成 15 年度	平成 17 年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	<p>歩道拡幅にあたっては、交通管理者 (路面標示及び信号移設) との協議が必要。</p> <p>電線共同溝の整備に先立ち、占用企業者との調整が必要。</p>		

イ 神奈川県

事業実施者	平塚土木事務所 神奈川県平塚市西八幡 1-3-1
-------	-----------------------------

① 県道706号

事業区間 (始点: 渋沢駅入口交差点 終点: 堀川小学校前交差点)

延長 (600) m

事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道巻込み部等の段差、こう配の改善	46 [箇所]	平成17年度	平成18年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,060 [m]	平成17年度	平成18年度
案内標識の設置	2 [箇所]	平成17年度	平成18年度
標識類の集約化	1 [式]	平成17年度	平成18年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	車両乗入れ部のこう配を改善するにあたっては、現場の状況に合わせて調整が必要。 標識類の集約化については、関係機関との調整が必要。		

② 県道707号

事業区間 (始点: 西公民館入口交差点 終点: 柳町交差点)

延長 (230) m

事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
歩道巻込み部等の段差、こう配の改善	19 [箇所]	平成16年度	平成16年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	460 [m]	平成16年度	平成16年度
案内標識の設置	1 [箇所]	平成16年度	平成16年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	車両乗入れ部のこう配を改善するにあたっては、現場の状況に合わせて調整が必要。 標識類の集約化については、関係機関との調整が必要。		

ウ 秦野市

事業実施者	建設部道路整備課 神奈川県秦野市桜町 1-3-2
-------	-----------------------------


① 市道 84 号線

事業区間 (始点: 渋沢駅入口交差点 終点: 西公民館入口交差点)

延長 (325) m

事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
細目グレーチングの設置	9 [箇所]	平成15年度	平成15年度
巻込み防止ポールの撤去	6 [箇所]	平成15年度	平成15年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	325 (650) [m]	平成15年度	平成15年度
案内標識の設置	3 [箇所]	平成15年度	平成17年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	区画整理事業により整備された地区であり、標識類の集約化を図る。		

■ 浜沢駅周辺地区道路特定事業計画

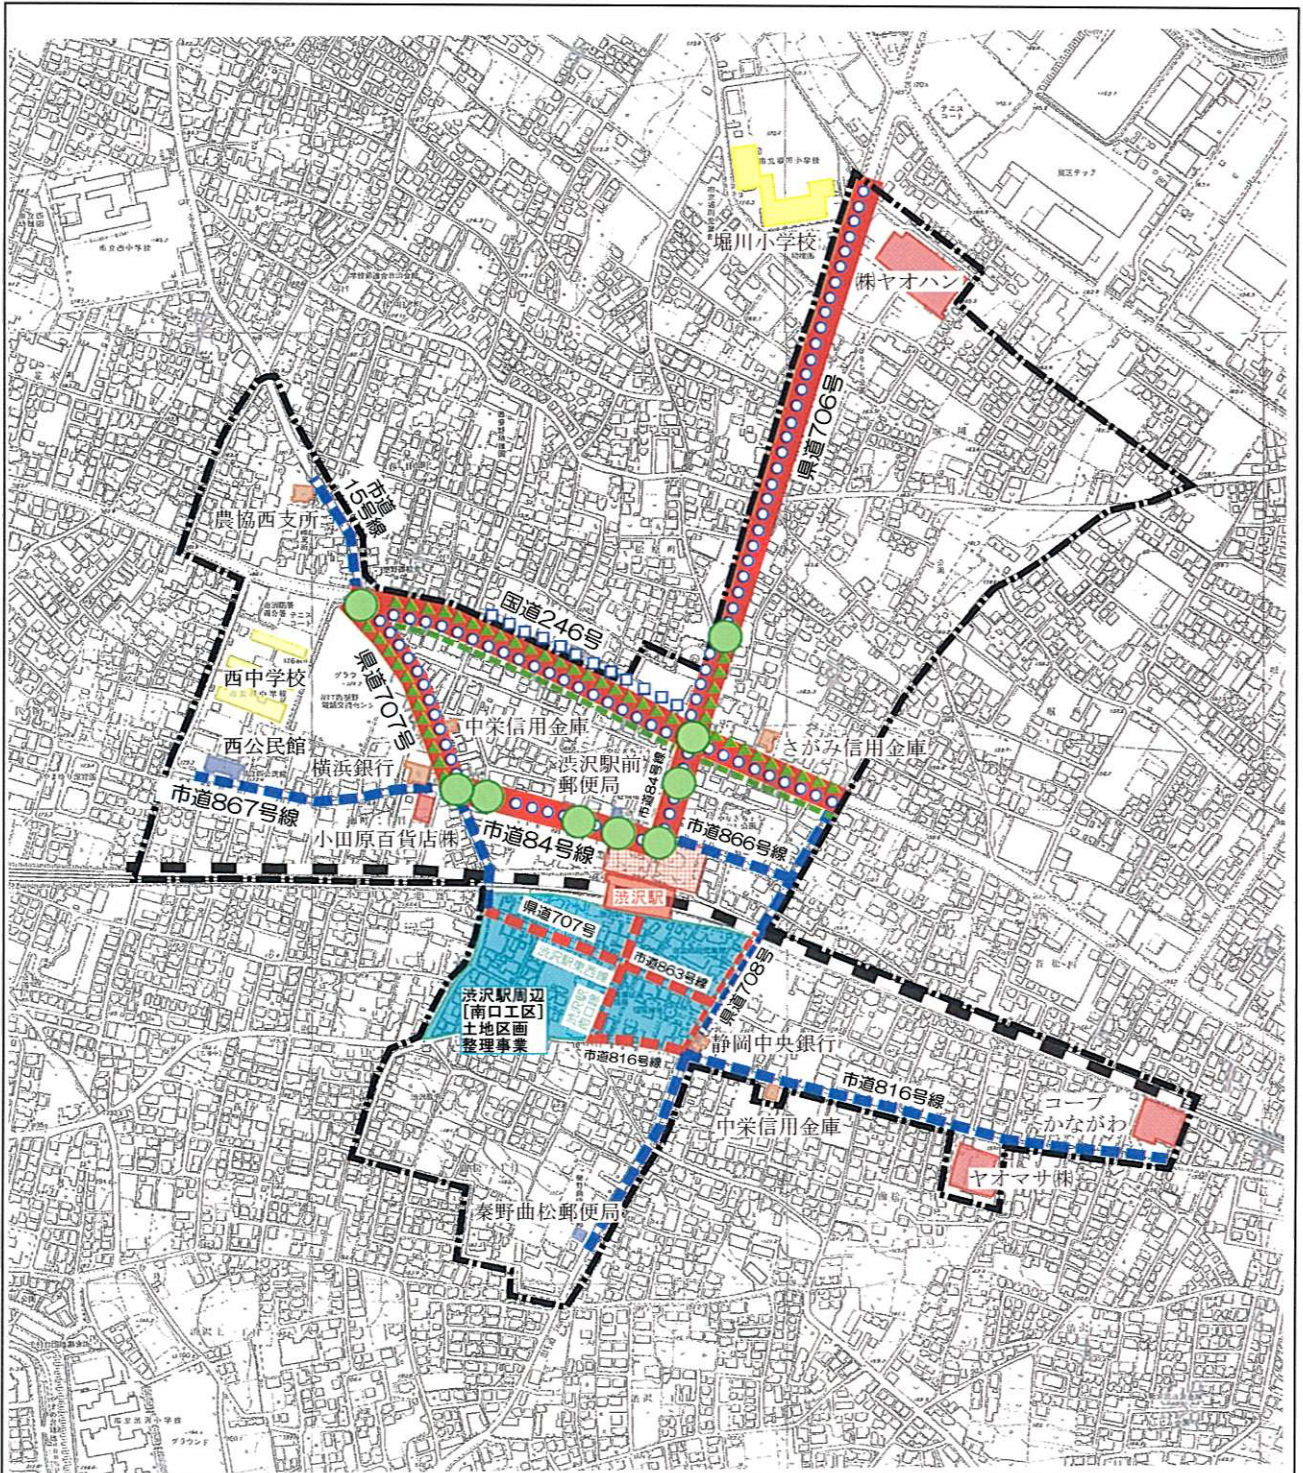

■道路特定事業計画の事業内容及び実施予定年度

事業主体	路線名	事業内容	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
国土交通省	国道246号 (曲松交差点～柳町交差点)	透水性舗装による歩道整備(拡幅)	■	■	■					
		段差・傾斜・こう配の改善	■	■	■					
		電線共同溝(CCB)整備 (渋沢駅入口交差点～市道860号線交差点)	■	■	■					
		視覚障害者誘導用ブロックの設置	■	■	■					
神奈川県	県道706号 (渋沢駅入口交差点～堀川小学校前交差点)	歩道巻込み部等の段差、こう配の改善			■	■				
		視覚障害者誘導用ブロックの設置			■	■				
		案内標識の設置			■	■				
		標識類の集約化			■	■				
	県道707号 (西公民館入口交差点～柳町交差点)	歩道巻込み部等の段差、こう配の改善		■	■					
		視覚障害者誘導用ブロックの設置		■	■					
秦野市	市道84号線 (渋沢駅入口交差点～西公民館入口交差点)	細目グレーチングの設置	■							
		巻込み防止ポールの撤去	■							
		視覚障害者誘導用ブロックの設置	■							
		案内標識の設置	■	■	■	■				

(3) 交通安全特定事業の事業内容及び実施予定年度

事業実施者	神奈川県公安委員会 神奈川県横浜市中区海岸通2-4
-------	------------------------------

路線名	事業実施箇所	事業内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
				着手	完了
国道246号	曲松交差点～柳町交差点	標識の高輝度化 オーバーハング化	2 [箇所]	平成17年度	平成17年度
県道706号	渋沢駅入口交差点～堀川小学校前交差点	標示の高輝度化	1 [式]	平成16年度	平成16年度
		内照式標識 オーバーハング化	2 [箇所]	平成16年度	平成16年度
県道707号	西公民館入口交差点～柳町交差点	横断歩道整備	2 [箇所]	平成16年度	平成16年度
		横断歩道標示の高輝度化	2 [箇所]	平成16年度	平成16年度
		標識の高輝度化	1 [式]	平成16年度	平成16年度
市道84号線	渋沢駅入口交差点～西公民館入口交差点	横断歩道標示の高輝度化	5 [箇所]	平成16年度	平成16年度
		標識の高輝度化	1 [式]	平成16年度	平成16年度

(4) その他の事業内容と実施予定年度


1) 駅前広場に関する事業計画 (渋沢駅)

渋沢駅北口広場は、公共交通特定事業との整合を図りつつ、エレベーターの設置などバリアフリー化を推進します。

南口駅前広場は、渋沢駅周辺〔南口工区〕土地区画整理事業による整備によりバリアフリー化を推進します。

① 渋沢駅北口広場

事業実施者	建設部建設管理課 神奈川県秦野市桜町1-3-2		
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
タクシー乗降場の歩道こう配改善	1 [箇所]	平成15年度	平成15年度
横断歩道部の車止め撤去	1 [箇所]	平成15年度	平成15年度
エレベーターの設置	1 [基]	平成15年度	平成15年度
駅前広場案内設備の設置	1 [箇所]	平成16年度	平成17年度
視覚障害者誘導用ブロックの設置	165 [m]	平成15年度	平成16年度
階段手すり端部への点字表示	4 [箇所]	平成15年度	平成15年度
階段手すりの改善	16 [箇所]	平成15年度	平成15年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	公共交通特定事業との整合を図る。		

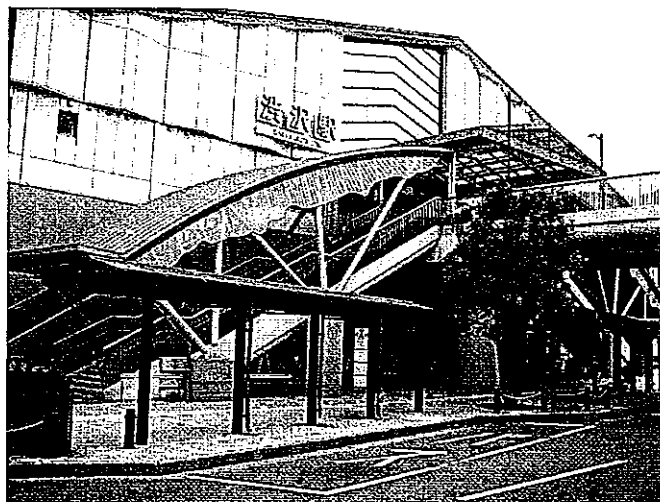

② 渋沢駅南口広場及び周辺整備事業

事業実施者	都市経済部渋沢駅南部区画整理事務所 神奈川県秦野市曲松 1-3-16
-------	---------------------------------------

事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
駅前広場の整備	3,000 [m ²]	平成17年度	平成18年度
渋沢駅南口線築造	70 (140) [m]	平成15年度	平成15年度
県道707号線歩道築造	123 (246) [m]	平成15年度	平成17年度
県道708号線歩道築造	122 [m]	平成15年度	平成15年度
市道816号線歩道築造	78 [m]	平成15年度	平成15年度
市道863号線歩道築造	78(156) [m]	平成15年度	平成17年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	渋沢駅周辺[南口工区]土地区画整理事業により整備を実施。		

□ 渋沢駅南口広場の整備イメージ


- ・南口広場には、エレベーター、身体障害者乗降用スペース等の設置を計画しています。



※計画途中のため変更する場合があります。

口渋沢駅南口周辺整備事業の整備イメージ

・南口駅前広場を新設し、これに通じる幹線道路を骨格として区画道路網を整備します。

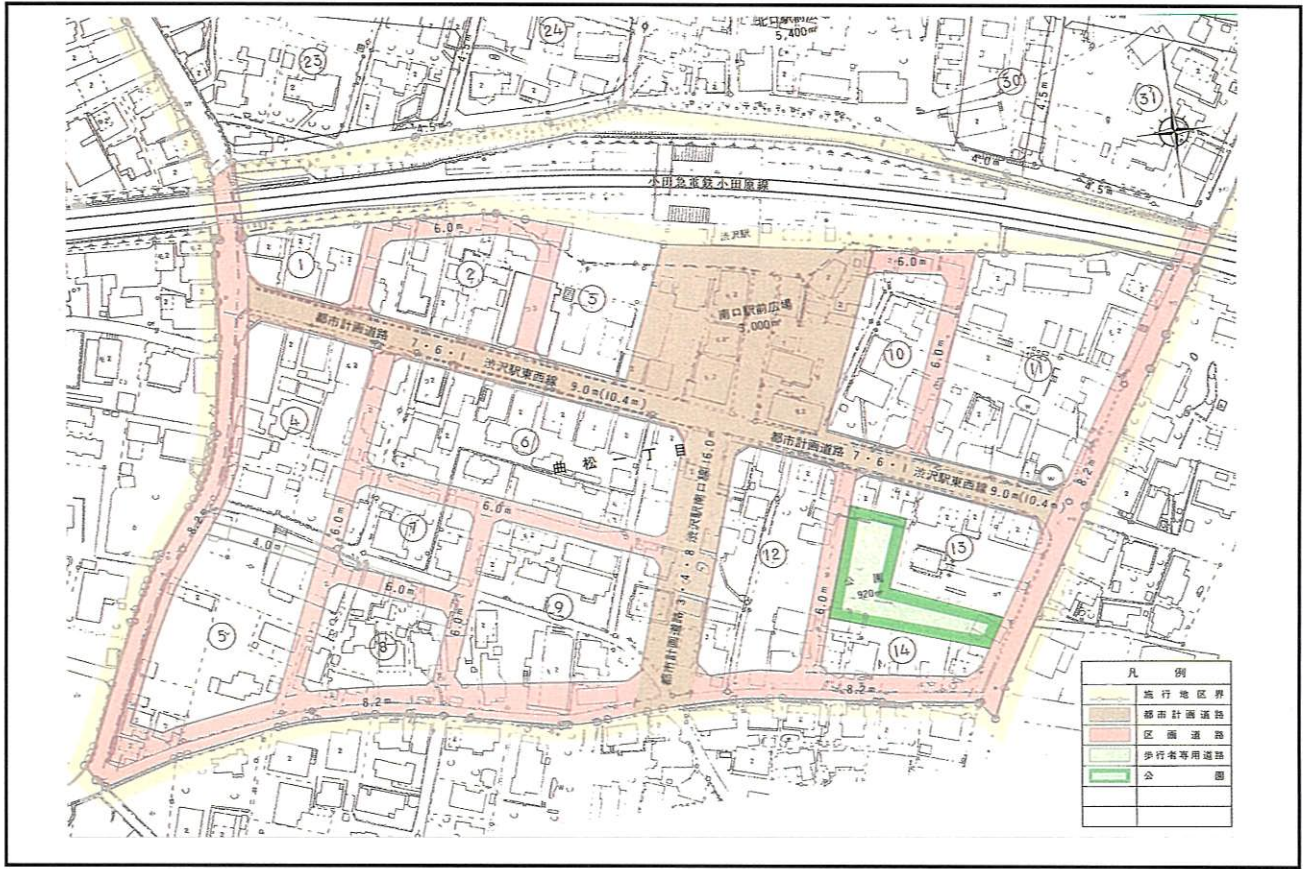

2) 公衆便所に関する事業計画 (渋沢駅)

① 渋沢駅北口公衆便所

事業実施者	環境農政部 環境衛生課 神奈川県秦野市桜町 1-3-2		
事業の内容	事業量 (延長/箇所数)	実施予定期間	
		着手	完了
案内表示板の設置	1 [基]	平成15年度	平成15年度
トイレ入口への点字プレートの設置	1 [基]	平成15年度	平成15年度
事業実施に際し配慮すべき 重要事項	既存の機能を活かした上で、利用しやすさ、認知性の向上を図る。整備に当たっては、交通事業者との調整が必要。		

■ その他の事業内容及び実施予定年度

事業主体	事業箇所	事業内容	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
秦野市	渋沢駅北口広場	タクシー乗降場の歩道こう配改善	■■■							
		横断歩道部の車止め撤去	■■■							
		エレベーターの設置	■■■							
		駅前広場案内設備の設置		■■■	■■■					
		視覚障害者誘導用ブロックの設置	■■■	■■■						
		階段手すり端部への点字表示	■■■							
		階段手すり改善	■■■							
	渋沢駅北口公衆便所	案内表示板の設置	■■■							
		トイレ入口への点字プレートの設置	■■■							
	渋沢駅南口広場及び周辺整備事業(渋沢駅周辺[南口工区]土地区画整理事業)	駅前広場の整備				■■■	■■■			
		渋沢駅南口線築造	■■■							
		県道707号歩道築造	■■■	■■■	■■■					
県道708号歩道築造		■■■								
市道816号線歩道築造		■■■								
市道863号線歩道築造	■■■	■■■	■■■							

第3章 特定事業計画等の推進に向けて

①計画の進行管理

- ・特定事業計画に基づく事業内容や整備の進捗状況は、広報やインターネットなど多様な方法により、広く市民へ公表します。
- ・事業の進捗状況等がこの特定事業計画と相違する場合や、社会状況などの変化に合わせて、より効果的な事業を推進するため、実情に沿って見直しを行います。
- ・各事業者が連携を強化し、整備が円滑に実施できるように努めます。

②継続的なバリアフリー化の推進

- ・バリアフリー化の推進を図るため、市民や関係機関との連絡・調整を行い、「すべての人にやさしい交通環境づくり」の実現へ向けて、総合的・継続的な取組みに努めます。



この市章は近代的な翼型
マークによって「ハダノ」
を表したものであり発展
向上する本市を力強くシ
ンボライズしている。

秦野市交通バリアフリー特定事業計画

編集・発行 秦野市建設部道路安全課
〒257-8501 神奈川県秦野市桜町一丁目3番2号
TEL. 0463-82-5111 (代)
FAX. 0463-84-4990
[http : //www.city.hadano.kanagawa.jp](http://www.city.hadano.kanagawa.jp)
E-mail : d-anzen@gr.city.hadano.kanagawa.jp
編集協力 ランドブレイン株式会社
